

PERENCANAAN PROYEK

Pengembangan Simulator Manajemen Kanal Video di Youtube



Dibuat oleh:

Axel Jeremy	6182301003
Joseph Davin Christian	6182301015
Alexander Constantijn	6182301031
Keane Edbert Candra	6182301075

Tanggal: 3 Oktober 2025

Kelompok 1

Jalan Ciumbuleuit No. 94, Hegarmanah, Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat 40141.

I. Ringkasan TOR

1.1. Latar Belakang

Dokumen *Terms of Reference* (TOR) ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Proyek. Melalui penyusunan TOR ini, mahasiswa dilatih untuk merancang, mendokumentasikan, serta mengelola suatu proyek perangkat lunak secara terstruktur dengan mengacu pada standar praktik manajemen proyek. Topik yang dipilih dalam tugas ini adalah pengembangan Simulator Manajemen Kanal Video di YouTube.

Di dalamnya, terdapat berbagai mekanisme penting seperti pembuatan kanal individu maupun grup, pengaturan hak akses, manajemen konten (*upload*, edit, hapus), serta interaksi pengguna publik berupa subscribe, komentar, *like*, dan *dislike*.

Selain itu, *platform* ini juga menyediakan laporan performa kanal dalam bentuk dashboard yang menampilkan data analitik seperti jumlah *viewer*, waktu tonton, interaksi penonton, hingga perkembangan jumlah *subscriber*. Simulator ini juga akan didukung dengan basis data yang mampu mencatat berbagai transaksi seperti *upload* video, interaksi penonton, serta aktivitas *subscribe/unsubscribe*.

Diharapkan dengan adanya proyek ini, mahasiswa mampu untuk mengasah keterampilannya baik dari hal teknis yang melingkupi manajemen basis data serta implementasinya dan juga keterampilan non teknis terutama dalam hal melakukan manajemen sebuah proyek.

1.2. Tujuan

Pada pekerjaan ini, Platform Manajemen Kanal Video akan dibuat sebagai bagian dari sistem yang menyediakan layanan konten video yang memiliki fitur yang mengakomodasi interaksi antara penonton dengan penyedia konten berupa video dan dikembangkan dengan rancangan perangkat lunak serta basis data yang sesuai. Platform ini nantinya dapat digunakan oleh *content creator* maupun penonton dengan beberapa fitur sebagaimana diterapkan pada spesifikasi perangkat lunak.

1.3. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Pengembang adalah:

1. Mempelajari dan memahami dokumen *Terms of References*.
2. Melakukan kegiatan analisis kebutuhan tambahan, termasuk dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Merancang aplikasi berbasis *Command-Line Interface* (CLI) sesuai dengan spesifikasi pada TOR serta kesepakatan lainnya antara pihak pengembang dan pemilik proyek.
4. Menyusun desain basis data, mengimplementasikan nya, serta memastikan bahwa fungsionalitasnya berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.
5. Melakukan pengujian terhadap sistem CLI dan menyusun laporan hasil pengujian yang akan disampaikan kepada pemilik proyek.
6. Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengujian.
7. Meluncurkan sistem simulator berbasis CLI yang telah selesai dan memenuhi standar yang disepakati.

8. Melakukan pemeliharaan sistem serta perbaikan atas kesalahan (*bug*) yang ditemukan sebelum dan sesudah sistem diluncurkan.


1.4. Hasil Pekerjaan

Dari pekerjaan ini, diharapkan akan menghasilkan:

- Membuat fitur penampil video dengan fitur *upload* dan *edit*.
- Menyediakan fitur *subscribe* kanal.
- Menyediakan fitur membuat dan mengedit kanal individu atau kanal grup.
- Merepresentasikan proses manajemen konten video (*upload*, *edit*, *publish*, *hapus/take-down*) yang dilakukan oleh pemilik kanal maupun anggota grup sesuai hak akses yang diberikan.
- Menyediakan interaksi bagi penonton kepada *content creator* melalui fitur komentar, *like* serta *dislike*.
- Menyediakan fitur pengaturan hak akses pengguna kanal grup: *Manager*, *Editor*, *Subtitle Editor*, dan *Viewer*, untuk mensimulasikan kolaborasi dalam pengelolaan kanal.
- Menyediakan basis data yang mengelola pengguna, kanal, konten video seperti *upload*, *view*, *subscribe/unsubscribe*, *like/dislike*, dan komentar.
- Menyediakan *dashboard* untuk menampilkan performa (data analisis video) seperti jumlah *view*, waktu tonton, komentar, dan jumlah *like/dislike*.

II. Perencanaan Pekerjaan, Organisasi, dan Jadwal

2.1 Gambar Lengkap WBS

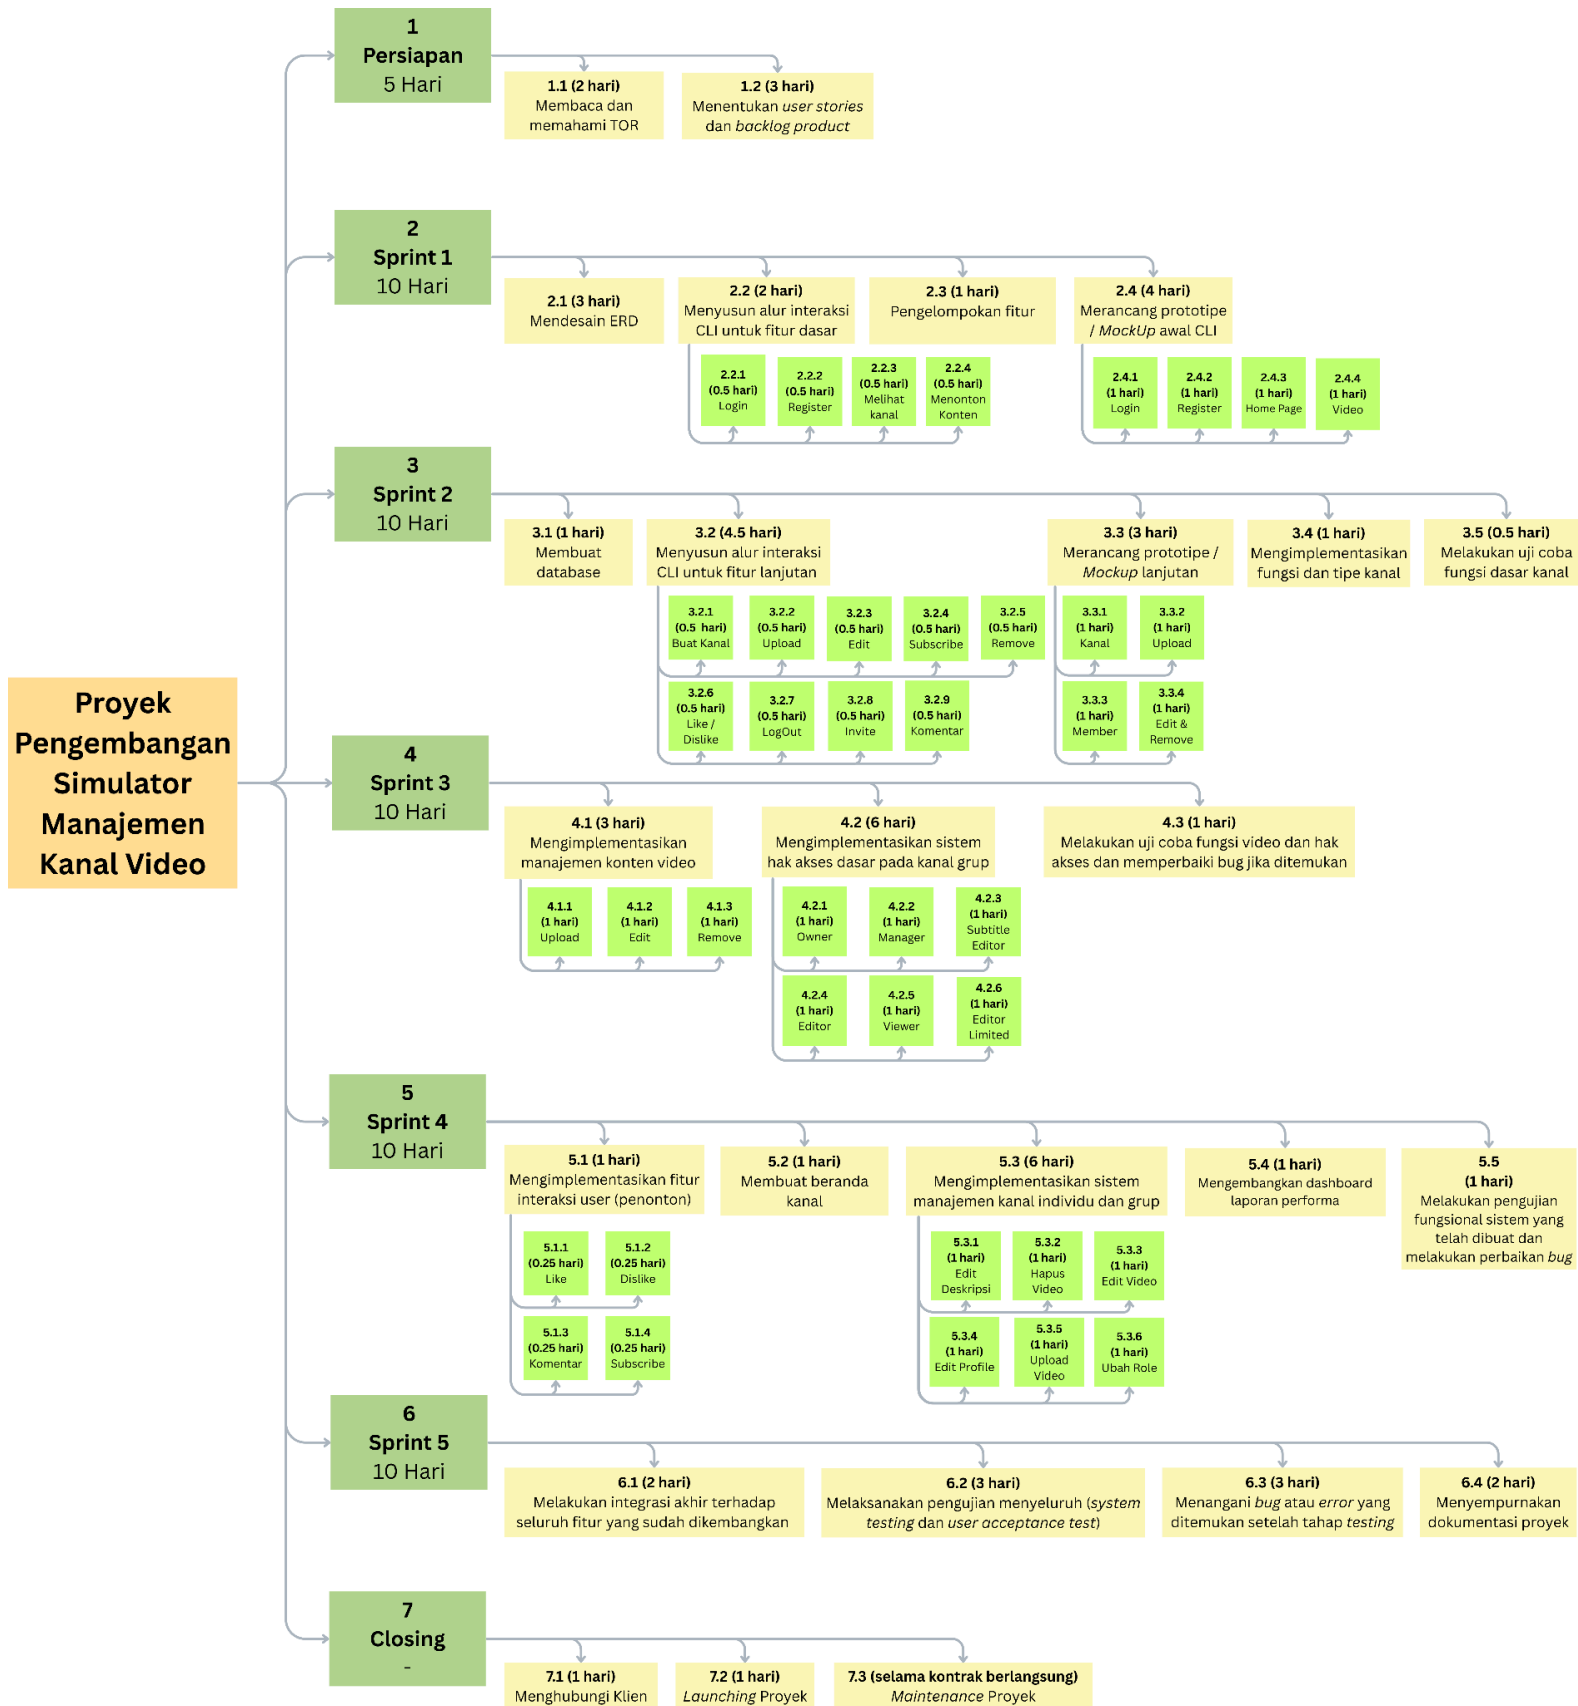

2.2. Deskripsi Tiap Work-Package

Nomor paket	1.1
Nama paket	Membaca dan memahami TOR
Deskripsi	Mempelajari secara menyeluruh dokumen <i>Terms of Reference</i> (TOR) yang disediakan oleh pihak pemberi proyek agar seluruh anggota tim memahami konteks, ruang lingkup, kebutuhan, tujuan, dan batasan proyek yang akan dilaksanakan.
SDM	Seluruh anggota tim
Durasi (lama dikerjakan)	2 Hari
Alat	10 Komputer atau Laptop
Presedence	-

Nomor paket	1.2
Nama paket	Menentukan User Stories dan Backlog product
Deskripsi	Mengidentifikasi, mendefinisikan, dan memprioritaskan <i>user stories</i> berdasarkan kebutuhan pengguna dan tujuan proyek, serta menyusunnya ke dalam <i>product backlog</i> .
SDM	Seluruh anggota tim
Durasi (lama dikerjakan)	3 Hari
Alat	± 10 lembar Kertas A4 / ± 70 lembar Sticky notes dan 5 pena
Presedence	1.1

Nomor paket	2.1
Nama paket	Mendesain ERD
Deskripsi	Perancangan <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) sebagai model konseptual basis data.
SDM	1 Backend Developer dengan pemahaman terkait ERD dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	3 hari
Alat	2 software Astah dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	2.2.1
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur <i>Login</i>
Deskripsi	Merancang alur <i>login</i> berbasis CLI dengan menentukan input (<i>username</i> , <i>password</i>), validasi, serta respon sistem.
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	2.2.2
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Register
Deskripsi	Merancang alur registrasi berbasis CLI dengan menentukan input (username, password), validasi, serta respon sistem.
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	2.2.3
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Melihat Kanal
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI untuk menampilkan halaman awal kanal dan konten kanal yang dipilih.
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	2.2.4
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Menonton Konten
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI pengguna untuk memilih konten, menampilkan detail konten, memutar, menghentikan, atau keluar dari mode tonton.
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	2.3
Nama paket	Melakukan Pengelompokan Fitur
Deskripsi	Mengelompokkan fitur sistem ke dalam beberapa kategori utama.
SDM	1 Scrum Master dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	2.4.1
Nama paket	Merancang prototipe awal Login
Deskripsi	Membuat rancangan prototipe awal fitur login berbasis CLI untuk memvisualisasikan proses login sebelum implementasi teknis dilakukan.
SDM	1 UI/UX Designer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 hari
Alat	1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer
Presedence	2.2.1

Nomor paket	2.4.2
Nama paket	Merancang prototipe awal Register
Deskripsi	Membuat rancangan prototipe awal fitur registrasi berbasis CLI untuk memvisualisasikan proses registrasi sebelum implementasi teknis dilakukan.
SDM	1 UI/UX Designer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 hari
Alat	1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer
Presedence	2.2.2

Nomor paket	2.4.3
Nama paket	Merancang prototipe awal Home Page / Beranda
Deskripsi	Membuat prototipe awal halaman beranda berbasis CLI yang menampilkan menu utama (misalnya login, register, melihat kanal, menonton konten) sebagai gambaran awal navigasi sistem sebelum implementasi.
SDM	1 UI/UX Designer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 hari
Alat	1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer
Presedence	2.2.3

Nomor paket	2.4.4
Nama paket	Merancang prototipe awal video
Deskripsi	Membuat prototipe awal tampilan video berbasis CLI yang menampilkan judul, deskripsi, opsi play/pause/stop, serta navigasi sederhana sebagai simulasi fitur menonton sebelum implementasi.
SDM	1 UI/UX Designer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 hari
Alat	1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer
Presedence	2.2.4

Nomor paket	3.1
Nama paket	Membuat database
Deskripsi	Membangun basis data sesuai rancangan ERD, meliputi pembuatan tabel, relasi, dan constraint agar sistem dapat menyimpan dan mengelola data secara terstruktur.
SDM	1 Database Engineer dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	2 SQL Server Management Studio, 2 komputer
Presedence	2.1

Nomor paket	3.2.1
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk membuat kanal
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna membuat kanal baru dengan input (nama, deskripsi, website, jenis), validasi data, serta menampilkan respon sistem sebagai acuan sebelum implementasi.
SDM	1 System Analyst dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	3.2.2
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk upload
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna mengunggah konten dengan input (judul, deskripsi, file).
SDM	1 System Analyst dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	3.2.3
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk edit konten
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna memilih konten, melakukan perubahan (judul atau deskripsi).
SDM	1 System Analyst dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	3.2.4
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk subscribe
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna memilih kanal, melakukan aksi subscribe/unsubscribe.
SDM	1 System Analyst dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	3.2.5
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk remove video
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna memilih video yang ingin dihapus, menampilkan konfirmasi, memproses penghapusan, serta memberikan respon sistem sebagai acuan implementasi fitur remove video.
SDM	1 System Analyst dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	3.2.6
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk like dan dislike
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna memberi like atau dislike pada konten, memvalidasi aksi, serta menampilkan respon sistem.
SDM	1 System Analyst dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	3.2.7
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk logout
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna keluar dari sesi akun.
SDM	1 System Analyst dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	3.2.8
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk invite role
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna dengan hak tertentu mengundang akun lain ke dalam kanal dengan peran tertentu.
SDM	1 System Analyst dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	3.2.9
Nama paket	Menyusun alur interaksi CLI untuk komentar
Deskripsi	Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna menambahkan komentar pada konten.
SDM	1 System Analyst dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	2 software Text Editor dan 2 komputer
Presedence	1.1, 1.2

Nomor paket	3.3.1
Nama paket	Merancang protitipe kanal
Deskripsi	Membuat prototipe tampilan halaman kanal berbasis CLI untuk pembuat kanal dan user yang menampilkan nama, deskripsi, dan konten yang dimiliki sebagai gambaran awal sebelum tahap implementasi teknis.
SDM	1 UI/UX Designer dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer
Presedence	2.2.3, 3.2.1

Nomor paket	3.3.2
Nama paket	Merancang protitipe upload
Deskripsi	Membuat prototipe fitur upload berbasis CLI untuk mensimulasikan proses unggah konten, mulai dari input judul, deskripsi, dan file hingga respon sistem.
SDM	1 UI/UX Designer dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer
Presedence	3.2.2

Nomor paket	3.3.3
Nama paket	Merancang prototipe member
Deskripsi	Membuat prototipe awal fitur daftar member kanal berbasis CLI yang menampilkan alur untuk melihat anggota, peran, serta opsi dasar sebagai simulasi sebelum implementasi teknis.
SDM	1 UI/UX Designer dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer
Presedence	3.2.1, 3.2.8

Nomor paket	3.3.4
Nama paket	Merancang prototipe edit dan remove video
Deskripsi	Membuat prototipe awal fitur edit dan remove video berbasis CLI yang menampilkan alur untuk mengedit deskripsi dan judul video serta melakukan remove video
SDM	1 UI/UX Designer dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer
Presedence	3.2.3, 3.2.5

Nomor paket	3.4
Nama paket	Melakukan implementasi fungsi dan tipe kanal
Deskripsi	Melakukan Coding untuk fitur user agar dapat memilih membuat kanal individu atau kanal grup
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.1

Nomor paket	3.5
Nama paket	Melakukan ujicoba fungsi dasar kanal
Deskripsi	Melakukan pengujian fitur dasar kanal seperti membuat kanal, melihat kanal, dan mengatur tipe kanal untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari error kritis.
SDM	3 QA Tester dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	0.5 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text editor dan 5 komputer
Presedence	3.4

Nomor paket	4.1.1
Nama paket	Mengimplementasikan manajemen upload video
Deskripsi	Mengembangkan fitur manajemen upload video yang mencakup proses penyimpanan metadata (judul, deskripsi, pemilik), serta integrasi dengan database agar konten dapat dikelola dan diakses dalam sistem.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.2

Nomor paket	4.1.2
Nama paket	Mengimplementasikan manajemen edit video
Deskripsi	Mengembangkan fitur manajemen edit video yang memungkinkan pengguna memperbarui metadata (judul atau deskripsi), memvalidasi perubahan, serta menyimpan hasil edit ke database.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.4

Nomor paket	4.1.3
Nama paket	Mengimplementasikan manajemen remove video
Deskripsi	Mengembangkan fitur manajemen penghapusan video yang memungkinkan pengguna memilih konten, melakukan konfirmasi, menghapus data dari database, serta memastikan integritas sistem setelah penghapusan.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.4

Nomor paket	4.2.1
Nama paket	Menerapkan sistem hak akses owner
Deskripsi	Mengatur hak akses khusus owner agar dapat mengelola fitur dan data secara penuh
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.1, 3.3.3

Nomor paket	4.2.2
Nama paket	Menerapkan sistem hak akses manager
Deskripsi	Mengatur hak akses manager agar dapat memantau dan mengelola data sesuai kewenangan.
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.1, 3.3.3

Nomor paket	4.2.3
Nama paket	Menerapkan sistem hak akses subtitle editor
Deskripsi	Mengatur hak akses subtitle editor agar dapat menambah, mengubah, dan menghapus subtitle.
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.1, 3.3.3

Nomor paket	4.2.4
Nama paket	Menerapkan sistem hak akses editor
Deskripsi	Mengatur hak akses editor agar dapat membuat, mengubah, dan menghapus konten.
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.1, 3.3.3

Nomor paket	4.2.5
Nama paket	Menerapkan sistem hak akses viewer
Deskripsi	Mengatur hak akses viewer agar hanya dapat melihat konten tanpa mengubah data.
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.1, 3.3.3

Nomor paket	4.2.6
Nama paket	Menerapkan sistem hak akses editor limited
Deskripsi	Mengatur hak akses editor terbatas agar hanya bisa mengubah konten tertentu sesuai izin.
SDM	1 Backend Developer dan 1 System Analyst
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.3.1, 3.3.3

Nomor paket	4.3
Nama paket	Melakukan uji coba fungsi video dan hak akses
Deskripsi	Menguji pemutaran video serta pengaturan hak akses untuk memastikan fungsi berjalan sesuai aturan.
SDM	3 QA Tester dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text editor dan 4 komputer
Presedence	4.1 (Seluruhnya), 4.2 (Seluruhnya)

Nomor paket	5.1.1
Nama paket	Mengimplementasikan fitur like
Deskripsi	Membuat fungsi untuk menambahkan tanda like pada video oleh pengguna.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	0.25 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	2.4.4, 3.1

Nomor paket	5.1.2
Nama paket	Mengimplementasikan fitur dislike
Deskripsi	Membuat fungsi untuk menambahkan tanda tidak suka pada video oleh pengguna.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	0.25 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	2.4.4, 3.1

Nomor paket	5.1.3
Nama paket	Mengimplementasikan fitur komentar
Deskripsi	Membuat sistem komentar agar pengguna dapat menambahkan dan membaca komentar pada video.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	0.25 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	2.4.4, 3.1

Nomor paket	5.1.4
Nama paket	Mengimplementasikan fitur subscribe
Deskripsi	Mengembangkan fitur subscribe/unsubscribe agar pengguna dapat mengikuti kanal tertentu.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	0.25 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	2.4.4, 3.1

Nomor paket	5.2
Nama paket	Membuat beranda kanal
Deskripsi	Membuat halaman beranda kanal yang menampilkan daftar video, profil kanal, dan statistik ringkas.
SDM	1 UI/UX Designer dan 1 Frontend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	2 software IDE Java dan 2 komputer
Presedence	3.3.1

Nomor paket	5.3.1
Nama paket	Mengimplementasikan sistem edit deskripsi pada kanal individu dan grup
Deskripsi	Menyediakan fitur untuk mengubah deskripsi kanal individu sesuai kebutuhan pemilik kanal.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.4, 5.2

Nomor paket	5.3.2
Nama paket	Mengimplementasikan sistem hapus video pada kanal individu dan grup
Deskripsi	Membuat fitur menghapus video dari kanal individu.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.4, 5.2

Nomor paket	5.3.3
Nama paket	Mengimplementasikan sistem edit video pada kanal individu dan grup
Deskripsi	Membuat fitur untuk mengubah detail video (judul, deskripsi) pada kanal individu.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.4, 5.2

Nomor paket	5.3.4
Nama paket	Mengimplementasikan sistem edit profile pada kanal individu dan grup
Deskripsi	Menyediakan fitur untuk mengubah profil kanal individu seperti nama kanal dan foto profil.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.4, 5.2

Nomor paket	5.3.5
Nama paket	Mengimplementasikan sistem upload video pada kanal individu dan grup
Deskripsi	Mengembangkan fitur untuk mengunggah video baru ke kanal individu dan menyimpannya di basis data.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.4, 5.2

Nomor paket	5.3.6
Nama paket	Mengimplementasikan sistem ubah role pada kanal grup saja
Deskripsi	Membangun fitur untuk memungkinkan pemilik kanal atau manajer mengubah peran anggota dalam kanal grup
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	3.1, 3.4, 5.2

Nomor paket	5.4
Nama paket	Mengembangkan dashboard laporan performa
Deskripsi	Membuat fitur dashboard yang menampilkan data analitik, seperti jumlah view, waktu tonton, komentar, like/dislike, serta video populer.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer
Presedence	5.2

Nomor paket	5.5
Nama paket	Melakukan pengujian fungsional sistem yang telah dibuat dan melakukan perbaikan bug
Deskripsi	Melakukan uji coba fungsional setiap fitur yang telah dikembangkan, serta memperbaiki bug/error yang ditemukan.
SDM	3 QA Tester, 1 Backend Developer, dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text editor dan 5 komputer
Presedence	5.1, 5.3, 5.4

Nomor paket	6.1
Nama paket	Melakukan integrasi akhir terhadap seluruh fitur yang sudah dikembangkan
Deskripsi	Menggabungkan seluruh fitur(kanal, video, interaksi, analitik) agar berfungsi sebagai satu sistem utuh.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	2 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
Presedence	3.5, 4.3, 5.5

Nomor paket	6.2
Nama paket	Melaksanakan pengujian menyeluruh (system testing dan user acceptance test)
Deskripsi	Menguji sistem secara menyeluruh, baik secara teknis (system testing) maupun dengan melibatkan pengguna akhir (UAT).
SDM	3 QA Tester dan 1 Backend Developer
Durasi (lama dikerjakan)	3 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, dan 4 komputer
Presedence	6.1

Nomor paket	6.3
Nama paket	Menangani bug atau error yang ditemukan setelah tahap testing
Deskripsi	Melakukan perbaikan terhadap bug/error yang terdeteksi pada tahap system testing maupun UAT.
SDM	1 Backend Developer dan 1 Database Engineer
Durasi (lama dikerjakan)	3 Hari
Alat	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, dan 2 komputer
Presedence	6.2

Nomor paket	6.4
Nama paket	Menyempurnakan dokumentasi proyek
Deskripsi	Menyusun dokumentasi teknis, panduan penggunaan sistem (user manual), serta laporan akhir proyek.
SDM	Scrum Master
Durasi (lama dikerjakan)	2 Hari
Alat	1 software Text Editor dan 1 komputer
Presedence	6.1

Nomor paket	7.1
Nama paket	Contact Klien
Deskripsi	Scrum Master melakukan komunikasi dengan client untuk menginfokan bahwa proyek sudah selesai.
SDM	Scrum Master
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	1 Handphone / Komputer, Email, Chat Messenger
Presedence	6.3 dan 6.4

Nomor paket	7.2
Nama paket	Launching Proyek
Deskripsi	Tim Developer dan client melakukan peluncuran proyek.
SDM	Scrum Master
Durasi (lama dikerjakan)	1 Hari
Alat	-
Presedence	7.1

2.3. Ringkasan Work Package dan Jaringan Pekerjaan

Ringkasan Work Package:

No. Paket	Nama Paket	Presedence	Durasi	SDM	Alat
1.1	Membaca dan memahami TOR	-	2 Hari	Seluruh anggota tim	10 Laptop / Komputer
1.2	Menentukan User Stories dan Backlog product	1.1	3 Hari	Seluruh anggota tim	± 10 lembar Kertas A4 / ± 70 lembar Sticky notes, 5 pena
2.1	Mendesain ERD	1.1, 1.2	3 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	2 software Astah, 2 komputer
2.2.1	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Login	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	2 software Text Editor, 2 komputer
2.2.2	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Register	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	2 software Text Editor, 2 komputer
2.2.3	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Melihat Kanal	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	2 software Text Editor, 2 komputer
2.2.4	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Menonton Konten	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	2 software Text Editor, 2 komputer

2.3	Melakukan Pengelompokan Fitur	1.1, 1.2	1 Hari	1 Scrum Master, 1 System Analyst	2 software Text Editor, 2 komputer
2.4.1	Merancang prototipe awal Login	2.2.1	1 Hari	1 UI/UX Designer, 1 System Analyst	1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer
2.4.2	Merancang prototipe awal Register	2.2.2	1 Hari	1 UI/UX Designer, 1 System Analyst	1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer
2.4.3	Merancang prototipe awal Home Page	2.2.3	1 Hari	1 UI/UX Designer, 1 System Analyst	1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer
2.4.4	Merancang prototipe awal Video	2.2.4	1 Hari	1 UI/UX Designer, 1 System Analyst	1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer
3.1	Membuat Database	2.1	1 Hari	1 Database Engineer, 1 Backend Developer	2 SQL Server Management Studio, 2 komputer
3.2.1	Menyusun alur interaksi CLI untuk membuat kanal	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 System Analyst, 1 Backend Developer	2 software Text Editor, 2 komputer
3.2.2	Menyusun alur interaksi CLI untuk upload	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 System Analyst, 1 Backend Developer	2 software Text Editor, 2 komputer
3.2.3	Menyusun alur interaksi CLI untuk edit konten	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 System Analyst, 1 Backend Developer	2 software Text Editor, 2 komputer
3.2.4	Menyusun alur interaksi CLI untuk subscribe	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 System Analyst, 1 Backend Developer	2 software Text Editor, 2 komputer
3.2.5	Menyusun alur interaksi CLI untuk remove video	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 System Analyst, 1 Backend Developer	2 software Text Editor, 2 komputer


3.2.6	Menyusun alur interaksi CLI untuk like dan dislike	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 System Analyst, 1 Backend Developer	2 software Text Editor, 2 komputer
3.2.7	Menyusun alur interaksi CLI untuk logout	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 System Analyst, 1 Backend Developer	2 software Text Editor, 2 komputer
3.2.8	Menyusun alur interaksi CLI untuk invite role	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 System Analyst, 1 Backend Developer	2 software Text Editor, 2 komputer
3.2.9	Menyusun alur interaksi CLI untuk komentar	1.1, 1.2	0.5 Hari	1 System Analyst, 1 Backend Developer	2 software Text Editor, 2 komputer
3.3.1	Merancang prototipe Kanal	2.2.3, 3.2.1	1 Hari	1 UI/UX Designer, 1 Backend Developer	1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer
3.3.2	Merancang prototipe Upload	3.2.2	1 Hari	1 UI/UX Designer, 1 Backend Developer	1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer
3.3.3	Merancang prototipe Member	3.2.1, 3.2.8	1 Hari	1 UI/UX Designer, 1 Backend Developer	1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer
3.3.4	Merancang prototipe Edit & Remove Video	3.2.3, 3.2.5	1 Hari	1 UI/UX Designer, 1 Backend Developer	1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer
3.4	Implementasi fungsi & tipe kanal	3.1, 3.3.1	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
3.5	Uji coba fungsi dasar kanal	3.4	0.5 Hari	3 QA Tester, 1 Backend Developer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 4 komputer


4.1.1	Implementasi manajemen upload video	3.1, 3.3.2	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
4.1.2	Implementasi manajemen edit video	3.1, 3.3.4	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
4.1.3	Implementasi manajemen remove video	3.1, 3.3.4	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
4.2.1	Sistem hak akses Owner	3.1, 3.3.1, 3.3.3	1 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
4.2.2	Sistem hak akses Manager	3.1, 3.3.1, 3.3.3	1 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
4.2.3	Sistem hak akses Subtitle Editor	3.1, 3.3.1, 3.3.3	1 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
4.2.4	Sistem hak akses Editor	3.1, 3.3.1, 3.3.3	1 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
4.2.5	Sistem hak akses Viewer	3.1, 3.3.1, 3.3.3	1 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
4.2.6	Sistem hak akses Editor Limited	3.1, 3.3.1, 3.3.3	1 Hari	1 Backend Developer, 1 System Analyst	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
4.3	Uji coba fungsi video & hak akses	4.1, 4.2	1 Hari	3 QA Tester, 1 Backend Developer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 4 komputer
5.1.1	Implementasi fitur Like	2.4.4, 3.1	0.25 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
5.1.2	Implementasi fitur Dislike	2.4.4, 3.1	0.25 Hari	1 Backend Developer, 1	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer


				Database Engineer	
5.1.3	Implementasi fitur Komentar	2.4.4, 3.1	0.25 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
5.1.4	Implementasi fitur Subscribe	2.4.4, 3.1	0.25 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
5.2	Membuat beranda kanal	3.3.1	1 Hari	1 UI/UX Designer, 1 Frontend Developer	2 software IDE Java, 2 komputer
5.3.1	Edit deskripsi kanal individu & grup	3.1, 3.4, 5.2	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
5.3.2	Hapus video pada kanal individu & grup	3.1, 3.4, 5.2	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
5.3.3	Edit video pada kanal individu & grup	3.1, 3.4, 5.2	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
5.3.4	Edit profil kanal individu & grup	3.1, 3.4, 5.2	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
5.3.5	Upload video kanal individu & grup	3.1, 3.4, 5.2	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
5.3.6	Ubah role pada kanal grup	3.1, 3.4, 5.2	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer

5.4	Dashboard laporan performa	5.2	1 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
5.5	Pengujian fungsional sistem & perbaikan bug	5.1, 5.3, 5.4	1 Hari	3 QA Tester, 1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, 5 komputer
6.1	Integrasi akhir seluruh fitur	3.5, 4.3, 5.5	2 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer
6.2	System testing & UAT	6.1	3 Hari	3 QA Tester, 1 Backend Developer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, 4 komputer
6.3	Menangani bug setelah testing	6.2	3 Hari	1 Backend Developer, 1 Database Engineer	1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, 2 komputer
6.4	Dokumentasi proyek	6.1	2 Hari	Scrum Master	1 software Text Editor, 1 komputer
7.1	Contact Klien	6.3, 6.4	1 Hari	Scrum Master	1 Handphone / Komputer, Email, Chat Messenger
7.2	Launching Proyek	7.1	1 Hari	Scrum Master	-


Gambar Jaringan Pekerjaan:

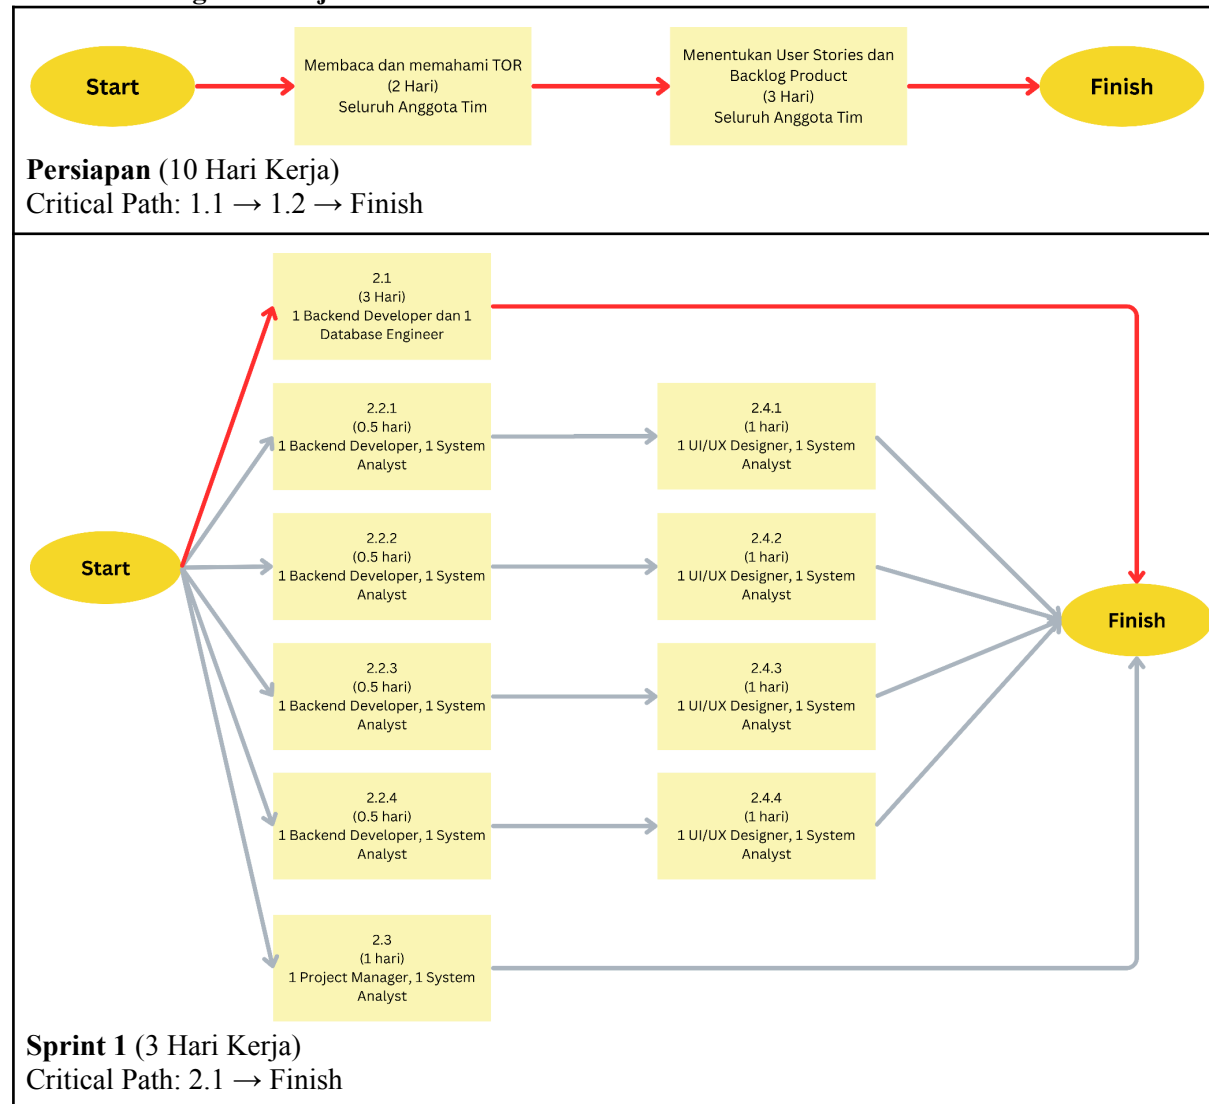

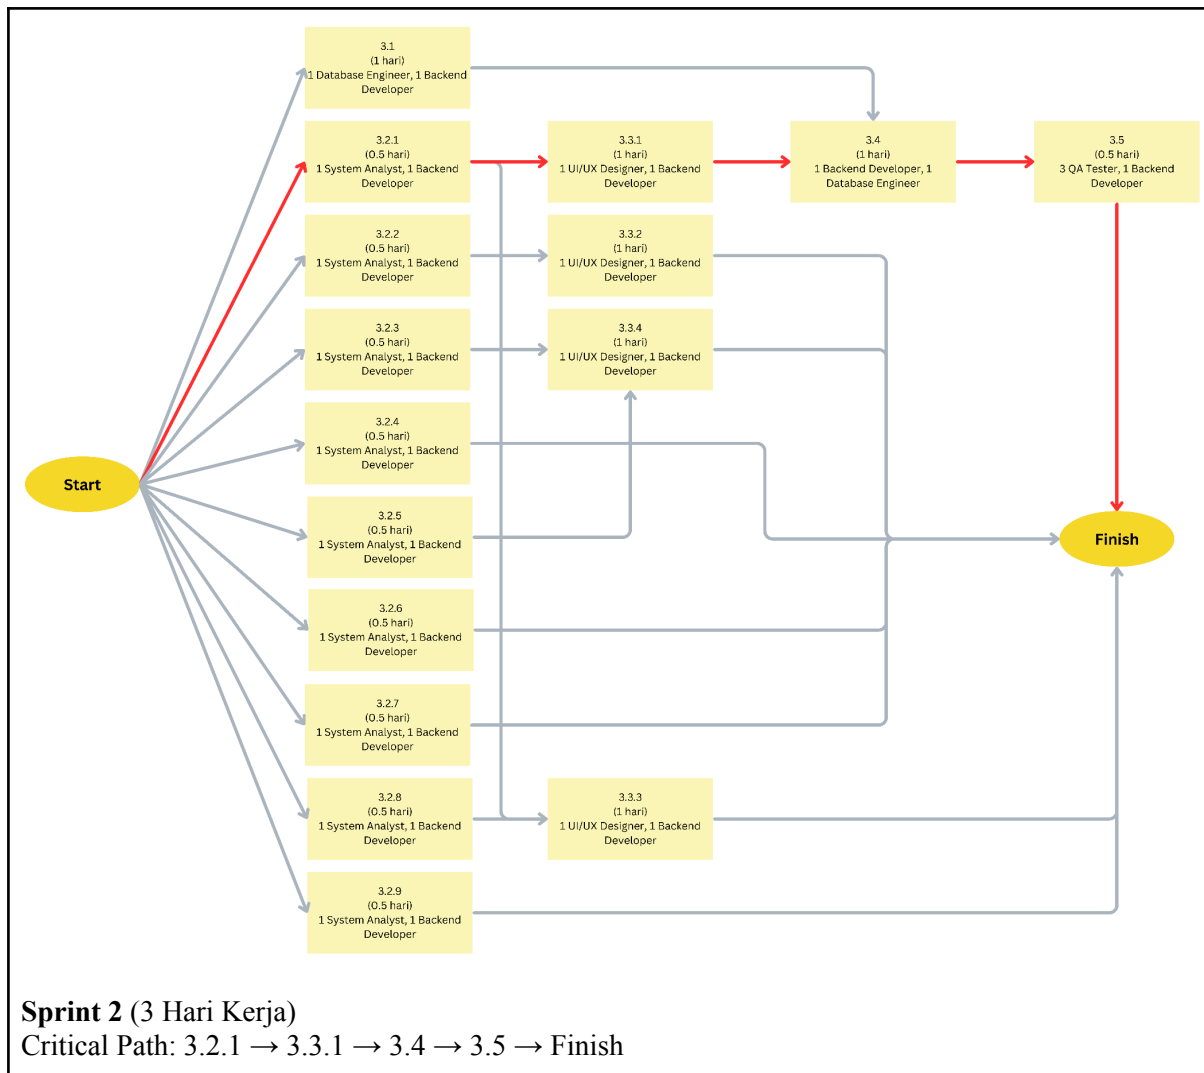


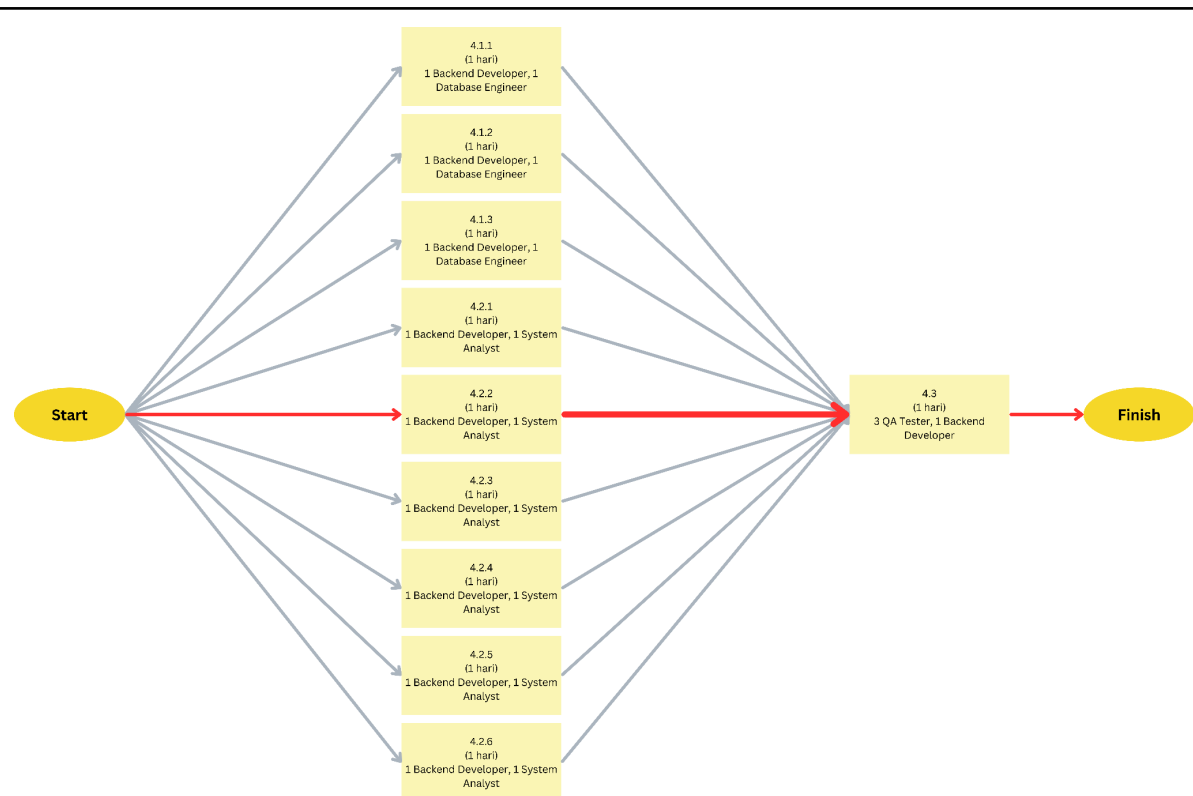

Sprint 3 (2 Hari kerja)
Critical Path: 4.2.2 → 4.3 → Finish

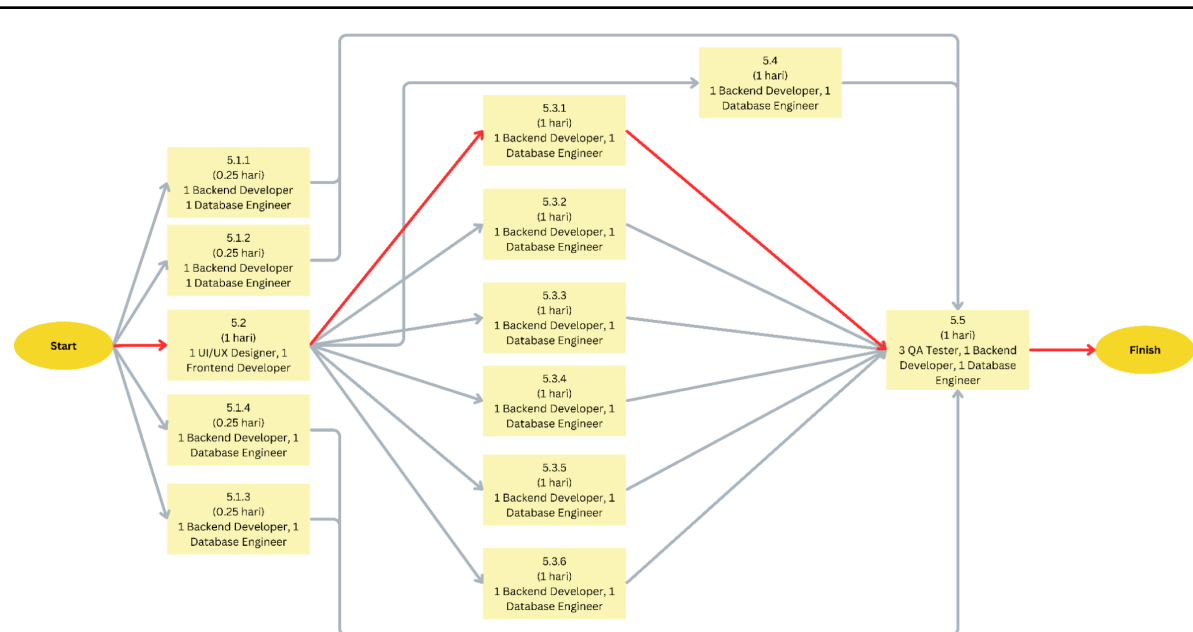

Sprint 4 (3 Hari kerja)
Critical Path: 5.2 → 5.3.1 → 5.5 → Finish

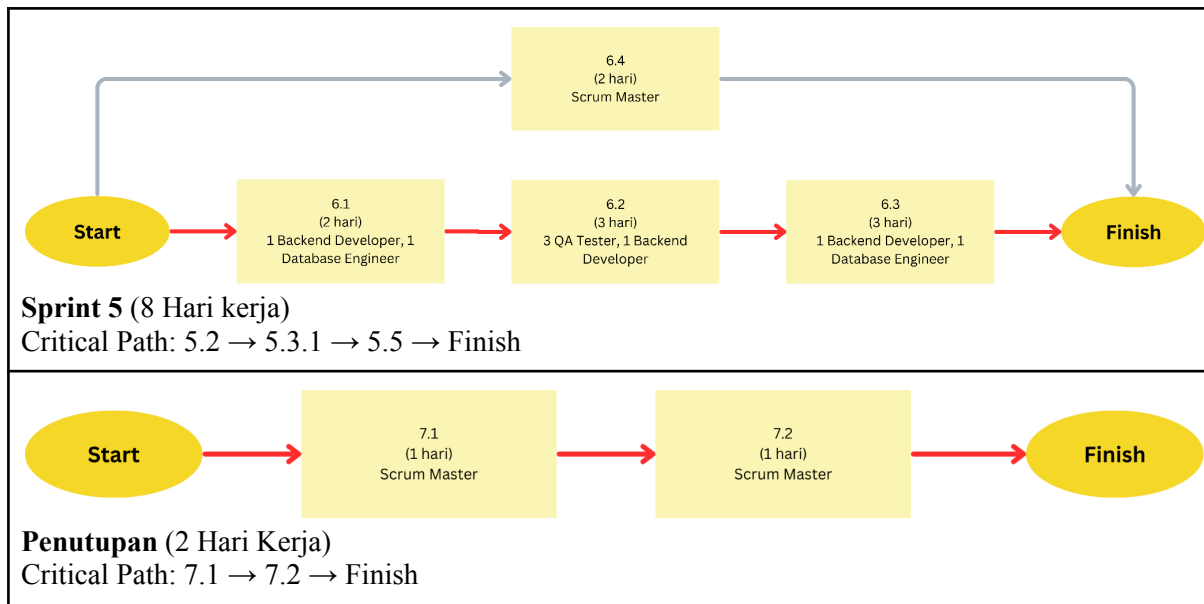

2.4. Jadwal Kegiatan, SDM, Alat, dan Pengeluaran

Tabel Satuan Gaji

Jenis Pekerjaan	Gaji / Hari
Backend Developer (BD)	Rp 80.000,-
Frontend Developer (FD)	Rp 70.000,-
Database Engineer (DE)	Rp 70.000,-
System Analyst (SA)	Rp 70.000,-
UI/UX Designer (UD)	Rp 70.000,-
QA Tester (QT)	Rp 50.000,-
Scrum Master (SM)	Rp 100.000,-

Tabel Satuan Beli Alat

Nama Alat	Harga Sewa atau Harga beli
Komputer / Laptop (K)	Rp 15.000,- / Hari
Kertas A4 (A4)	Rp 1000,- /Pcs
Pena (P)	Rp 5000,-/Pcs
Sticky notes (SN)	Rp 500,- /Pcs
Text Editor (TE)	Gratis
Astah (A)	Gratis

SSMS	Gratis
IDE	Gratis
Email / Messenger	Gratis

Jadwal kegiatan, SDM, alat dan pengeluaran:

• **Jadwal Persiapan (Sprint 0)**

No	Nama Paket	Jadwal Paket Pekerjaan (Satuan: 1 Hari)				
		Masa Persiapan				
		1	2	3	4	5
1.1	Membaca dan Memahami TOR	Full	Full			
1.2	Menentukan User Stories dan Backlog product			Full	Full	Full
Jadwal SDM		2BD, 1FD, 1SM, 1SA, 1DE, 1UD, 3QT				
Jadwal Alat		10K	10K	10A4 , 70SN, 5P		
Gaji SDM		690 rb	690 rb	690 rb	690 rb	690 rb
Biaya Alat		150 rb	150 rb	70 rb	70 rb	70 rb
Pengeluaran Proyek		840 rb	840 rb	760 rb	760 rb	760 rb

• **Jadwal Sprint 1**

No	Nama Paket	Jadwal Paket Pekerjaan (Satuan: 1 Hari)									
		Sprint ke-1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Mendesain ERD	1BD, 1DE	1BD 1DE	1BD 1DE							
2.2.1	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Login	1BD 1SA									
2.2.2	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Register		1BD 1SA								
2.2.3	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Melihat Kanal			1BD 1SA							

2.2.4	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Menonton Konten				1BD 1SA							
2.3	Melakukan Pengelompokan Fitur					1SM 1SA						
2.4.1	Merancang prototipe awal Login						1UD 1SA					
2.4.2	Merancang prototipe awal Register							1UD 1SA				
2.4.3	Merancang prototipe awal Home Page								1UD 1SA			
2.4.4	Merancang prototipe awal Video									1UD 1SA		
Jadwal SDM		2BD 1SA 1DE	2BD 1SA 1DE	2BD 1SA 1DE	2BD 1DE 1SA	1SM 1SA	1UD 1SA	1UD 1SA	1UD 1SA	1UD 1SA	-	-
Jadwal Alat		4K	4K	4K	4K	2K	2K	2K	2K	2K	-	-
Gaji SDM		300 rb	300 rb	300 rb	300 rb	170 rb	140 rb	140 rb	140 rb	140 rb	-	-
Biaya Alat		60 rb	60 rb	60 rb	60 rb	30 rb	30 rb	30 rb	30 rb	30 rb	-	-
Pengeluaran Proyek		360 rb	360 rb	360 rb	360 rb	200 rb	170 rb	170 rb	170 rb	170 rb	-	-

• **Jadwal Sprint 2**

No	Nama Paket	Jadwal Paket Pekerjaan (Satuan: 1 Hari)													
		Sprint ke-2													
		1	2	3	4	5	6	7							
3.1	Membuat Database	1DE, 1BD													
3.2.1	Menyusun alur interaksi CLI untuk membuat kanal	1SA 1BD													
3.2.2	Menyusun alur interaksi CLI untuk upload		1SA 1BD												
3.2.3	Menyusun alur interaksi CLI untuk edit konten			1SA 1BD											
3.2.4	Menyusun alur interaksi CLI untuk subscribe				1SA 1BD										
3.2.5	Menyusun alur interaksi CLI untuk remove video					1SA 1BD									
3.2.6	Menyusun alur interaksi CLI untuk like dan dislike						1SA 1BD								
3.2.7	Menyusun alur interaksi CLI untuk logout							1SA 1BD							
3.2.8	Menyusun alur interaksi CLI untuk invite role								1SA 1BD						


3.2.9	Menyusun alur interaksi CLI untuk komentar								1SA 1BD					
3.3.1	Merancang prototipe Kanal				1BD 1UD									
3.3.2	Merancang prototipe Upload						1UD 1BD							
3.3.3	Merancang prototipe Member									1UD 1 BD				
3.3.4	Merancang prototipe Edit & Remove Video								1UD 1BD					
3.4	Implementasi fungsi & tipe kanal										1DE 1BD			
3.5	Uji coba fungsi dasar kanal												3QT 1BD	
Jadwal SDM		2 BD 1 DE 1 SA		1 SA 1,5 BD 0,5 UD		1 SA 2 BD 1 UD		1 SA 2 BD 1 UD		0,5 SA 1,5 BD 1 UD		0,5 UD 1,5 BD 1 DE		3QT 1BD
Jadwal Alat		4K		4K		4K		4K		4K		4K		4K
Gaji SDM		300 rb		225 rb		300 rb		300 rb		225 rb		225 rb		230 rb
Biaya Alat		60 rb		60 rb		60 rb		60 rb		60 rb		60 rb		60 rb
Pengeluaran Proyek		360 rb		285 rb		360 rb		360 rb		285 rb		285 rb		290 rb

• **Jadwal Keseluruhan**

No	Nama Paket	Jadwal Paket Pekerjaan (Satuan: 3 Hari)													
		Seluruh Proyek													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persiapan	■	■	■											
2	Sprint 1			■	■	■	■								
3	Sprint 2					■	■	■	■	■					
4	Sprint 3								■	■	■				
5	Sprint 4									■	■	■	■		
6	Sprint 5											■	■	■	■
7	Closing													■	■

2.5. Organisasi Proyek

Struktur Organisasi

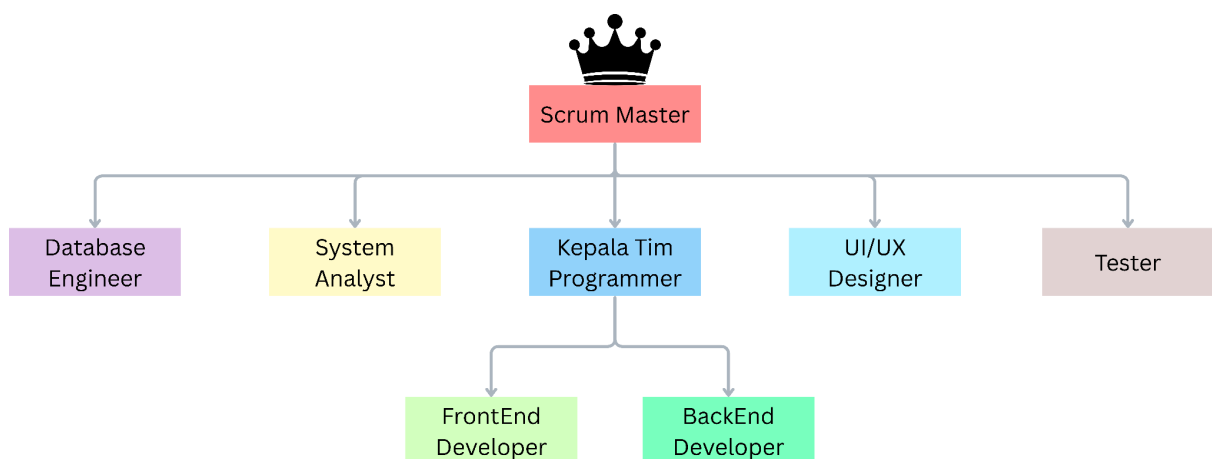

Responsibility Assignment Matrix (RAM)

No.	Paket Pekerjaan	Axel (SM)	Keane (BD)	Davin (BD)	Alex (FD)	Ares (DE)	Athena (SA)	Charon (UD)	Hermes (QT)	Hades (QT)	Papin (QT)
1.1	Membaca dan memahami TOR	A,R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
1.2	Menentukan User Stories dan Backlog product	A,R,Q	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2.1	Mendesain ERD		R			A,R	C				
2.2.1	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Login			R			A,R				
2.2.2	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Register			R			A,R				
2.2.3	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Melihat Kanal			R			A,R				
2.2.4	Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Menonton Konten			R			A,R				
2.3	Melakukan Pengelompokan Fitur	R			C		A,R				
2.4.1	Merancang prototipe awal Login						R	A,R			
2.4.2	Merancang prototipe awal Register						R	A,R			
2.4.3	Merancang prototipe awal Home Page						R	A,R			
2.4.4	Merancang prototipe awal Video						R	A,R			
3.1	Membuat Database			R		A,R					

3.2.1	Menyusun alur interaksi CLI untuk membuat kanal		R				A,R				
3.2.2	Menyusun alur interaksi CLI untuk upload		R				A,R				
3.2.3	Menyusun alur interaksi CLI untuk edit konten		R				A,R				
3.2.4	Menyusun alur interaksi CLI untuk subscribe		R				A,R				
3.2.5	Menyusun alur interaksi CLI untuk remove video		R				A,R				
3.2.6	Menyusun alur interaksi CLI untuk like dan dislike		R				A,R				
3.2.7	Menyusun alur interaksi CLI untuk logout		R				A,R				
3.2.8	Menyusun alur interaksi CLI untuk invite role		R				A,R				
3.2.9	Menyusun alur interaksi CLI untuk komentar		R				A,R				
3.3.1	Merancang prototipe Kanal			R			C	A,R			
3.3.2	Merancang prototipe Upload			R			C	A,R			
3.3.3	Merancang prototipe Member			R			C	A,R			
3.3.4	Merancang prototipe Edit & Remove Video			R			C	A,R			
3.4	Implementasi fungsi & tipe kanal		A,R,Q			R					

3.5	Uji coba fungsi dasar kanal								A,R	R	R
4.1.1	Implementasi manajemen upload video		A,R, Q			R					
4.1.2	Implementasi manajemen edit video		A,R, Q			R					
4.1.3	Implementasi manajemen remove video		A,R, Q			R					
4.2.1	Sistem hak akses Owner			A,R			R				
4.2.2	Sistem hak akses Manager			A,R		C	R				
4.2.3	Sistem hak akses Subtitle Editor			A,R		C	R				
4.2.4	Sistem hak akses Editor			A,R		C	R				
4.2.5	Sistem hak akses Viewer			A,R		C	R				
4.2.6	Sistem hak akses Editor Limited			A,R		C	R				
4.3	Uji coba fungsi video & hak akses								A,R	R	R
5.1.1	Implementasi fitur Like		A,R, Q			R					
5.1.2	Implementasi fitur Dislike		A,R, Q			R					
5.1.3	Implementasi fitur Komentar		A,R, Q			R					
5.1.4	Implementasi fitur Subscribe		A,R, Q			R					
5.2	Membuat beranda kanal		R					A,R			
5.3.1	Edit deskripsi kanal individu & grup			A,R		R,C					

5.3.2	Hapus video pada kanal individu & grup			A,R		R,C					
5.3.3	Edit video pada kanal individu & grup			A,R		R,C					
5.3.4	Edit profil kanal individu & grup			A,R		R,C					
5.3.5	Upload video kanal individu & grup			A,R		R,C					
5.3.6	Ubah role pada kanal grup			A,R		R,C					
5.4	Dashboard laporan performa		A,R			R,C					
5.5	Pengujian fungsional sistem & perbaikan bug								A,R	R	R
6.1	Integrasi akhir seluruh fitur		A,R			R					
6.2	System testing & UAT								A,R	R	R
6.3	Menangani bug setelah testing		A,R			R					
6.4	Dokumentasi proyek	A,R									
7.1	Contact Klien	A, R									
7.2	Launching Proyek	A, R									

*R-Responsible (works on), A-Accountable, C-Consulted, I-Informed, Q- Quality Reviewer

Ringkasan Tugas, Peran dan Tanggung-jawab Tim

No.	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Axel (Scrum Master)	• Memimpin tim dan bertanggung jawab penuh atas proyek (Accountable). • Membaca dan memahami TOR serta memastikan scope jelas. • Menentukan user stories dan backlog. • Mengawasi implementasi kanal, video, fitur, dan hak akses. • Memastikan dokumentasi proyek lengkap. • Menjadi penghubung dengan klien, termasuk saat contact client & launching.
2.	Keane (Backend Developer)	• Mengimplementasikan fungsi backend: kanal, upload, edit, remove video, like/dislike, komentar, subscribe. • Membuat database dan mengelola logika server. • Bertanggung jawab dalam uji coba fungsi kanal & video. • Membantu integrasi akhir dan perbaikan bug setelah testing.
3.	Davin (Backend Developer)	• Berperan mirip dengan Keane, fokus di backend. • Menyusun alur interaksi CLI untuk login, register, melihat kanal, menonton konten, dan fitur kanal lain. • Mengimplementasikan hak akses (Owner, Manager, Editor, Subtitle Editor, Viewer). • Mendukung integrasi sistem dan bug fixing.
4.	Alex (Frontend Developer)	• Merancang prototipe awal: login, register, homepage, video. • Merancang prototipe kanal, upload, member, edit/remove video. • Membuat tampilan beranda kanal. • Bekerja sama dengan UI/UX Designer untuk memastikan tampilan sesuai user experience.
5.	Ares (Database Engineer)	• Mendesain ERD dan struktur database. • Membuat serta mengelola database. • Menjamin konsistensi data untuk fitur kanal, video, dan user. • Memberi masukan terkait performa database dan optimisasi query.
6.	Athena (System Analyst)	• Memahami TOR dan requirement. • Memberi masukan (Consulted) pada desain database, pengelompokan fitur, dan prototipe. • Memastikan sistem sesuai kebutuhan bisnis. • Menjadi penghubung antara tim developer dan product owner.
7.	Charon	• Merancang prototipe awal bersama Frontend Developer.

	(UI/UX Designer)	● Membuat user interface: login, register, home page, video, kanal, upload, edit & remove video, member. ● Menjamin prototipe sesuai prinsip user experience.
8.	Hermes (Quality Tester)	● Melakukan uji coba fungsi dasar kanal. ● Menguji fungsi video & hak akses. ● Menguji fungsional sistem & membantu menemukan bug. ● Ikut serta dalam system testing & UAT
9.	Hades (Quality Tester)	● Melakukan tugas yang sama dengan Hermes ● Menguji fungsi dasar kanal, video & hak akses, fungsional sistem. ● Memberi laporan bug dan validasi perbaikan.
10.	Papin (Quality Tester)	● Mendukung Hermes & Hades dalam testing. ● Fokus pada UAT (User Acceptance Testing). ● Membantu regression test setelah bug fixing.

III. Anggaran Proyek

5.1. Komponen gaji SDM:

No	Deskripsi	Satuan Waktu (hari)	Biaya/harga per Satuan	Sub Total
1.	Scrum Master	9 hari	Rp 100.000,- /hari	Rp 900.000,-
2.	System Analyst	27 hari	Rp 70.000,- /hari	Rp 1.890.000,-
3.	Frontend Developer	6 hari	Rp 70.000,- /hari	Rp 420.000,-
4.	Backend Developer	63 hari	Rp 80.000,- /hari	Rp 5.040.000,-
5.	Tester	37 hari	Rp 50.000,- /hari	Rp 1.850.000
6.	Database Engineer	27 hari	Rp 70.000,- /hari	Rp 1.890.000,-
7.	UI/UX Designer	14 hari	Rp 70.000,- /hari	Rp 980.000,-
Total:				Rp 12.970.000,-

5.2. Komponen sewa alat:

No	Deskripsi	Satuan atau Jumlah	Biaya/harga Satuan	Sub Total
1.	Komputer / Laptop (K)	144	Rp 15.000/hari	Rp 2.160.000,-
2.	Kertas A4 (A4)	10	Rp 1000,- /Pcs	Rp 10.000,-
3.	Pena (P)	5	Rp 5000,- /Pcs	Rp 25.000,-
4.	Sticky notes (SN)	70	Rp 500,- /Pcs	Rp 35.000,-
5.	Text Editor (TE)	10	Gratis	Rp 0,-
6.	Astah (A)	10		
7.	SSMS	10		
8.	IDE	10		
9.	Email / Messenger	10		
Total:				Rp 2.230.000,-

5.3. Anggaran keseluruhan proyek:

No	Komponen Anggaran	Sub Total
1	Gaji SDM	Rp 12.970.000,-
2	Beli alat	Rp 2.230.000,
Total:		Rp 15.200.000,-

Lampiran

https://drive.google.com/file/d/1z2DpS9ugc0khF_yHJU7n11d520ZEvSJM/view?usp=drive_link (TOR)
