

## PERENCANAAN PROYEK

# Pengembangan Simulator Manajemen Kanal Video di Youtube



Dibuat oleh:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Axel Jeremy            | 6182301003 |
| Joseph Davin Christian | 6182301015 |
| Alexander Constantijn  | 6182301031 |
| Keane Edbert Candra    | 6182301075 |

Tanggal: 3 Oktober 2025

Kelompok 1

Jalan Ciumbuleuit No. 94, Hegarmanah, Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat 40141.

## I. Ringkasan TOR

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen *Terms of Reference* (TOR) ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Proyek. Melalui penyusunan TOR ini, mahasiswa dilatih untuk merancang, mendokumentasikan, serta mengelola suatu proyek perangkat lunak secara terstruktur dengan mengacu pada standar praktik manajemen proyek. Topik yang dipilih dalam tugas ini adalah pengembangan Simulator Manajemen Kanal Video di YouTube.

Di dalamnya, terdapat berbagai mekanisme penting seperti pembuatan kanal individu maupun grup, pengaturan hak akses, manajemen konten (*upload*, edit, hapus), serta interaksi pengguna publik berupa subscribe, komentar, *like*, dan *dislike*.

Selain itu, *platform* ini juga menyediakan laporan performa kanal dalam bentuk dashboard yang menampilkan data analitik seperti jumlah *viewer*, waktu tonton, interaksi penonton, hingga perkembangan jumlah *subscriber*. Simulator ini juga akan didukung dengan basis data yang mampu mencatat berbagai transaksi seperti *upload* video, interaksi penonton, serta aktivitas *subscribe/unsubscribe*.

Diharapkan dengan adanya proyek ini, mahasiswa mampu untuk mengasah keterampilannya baik dari hal teknis yang melingkupi manajemen basis data serta implementasinya dan juga keterampilan non teknis terutama dalam hal melakukan manajemen sebuah proyek.

### 1.2. Tujuan

Pada pekerjaan ini, Platform Manajemen Kanal Video akan dibuat sebagai bagian dari sistem yang menyediakan layanan konten video yang memiliki fitur yang mengakomodasi interaksi antara penonton dengan penyedia konten berupa video dan dikembangkan dengan rancangan perangkat lunak serta basis data yang sesuai. Platform ini nantinya dapat digunakan oleh *content creator* maupun penonton dengan beberapa fitur sebagaimana diterapkan pada spesifikasi perangkat lunak.

### 1.3. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Pengembang adalah:

1. Mempelajari dan memahami dokumen *Terms of References*.
2. Melakukan kegiatan analisis kebutuhan tambahan, termasuk dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Merancang aplikasi berbasis *Command-Line Interface* (CLI) sesuai dengan spesifikasi pada TOR serta kesepakatan lainnya antara pihak pengembang dan pemilik proyek.
4. Menyusun desain basis data, mengimplementasikan nya, serta memastikan bahwa fungsionalitasnya berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.
5. Melakukan pengujian terhadap sistem CLI dan menyusun laporan hasil pengujian yang akan disampaikan kepada pemilik proyek.
6. Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengujian.
7. Meluncurkan sistem simulator berbasis CLI yang telah selesai dan memenuhi standar yang disepakati.

8. Melakukan pemeliharaan sistem serta perbaikan atas kesalahan (*bug*) yang ditemukan sebelum dan sesudah sistem diluncurkan.


#### **1.4. Hasil Pekerjaan**

Dari pekerjaan ini, diharapkan akan menghasilkan:

- Membuat fitur penampil video dengan fitur *upload* dan *edit*.
- Menyediakan fitur *subscribe* kanal.
- Menyediakan fitur membuat dan mengedit kanal individu atau kanal grup.
- Merepresentasikan proses manajemen konten video (*upload*, *edit*, *publish*, *hapus/take-down*) yang dilakukan oleh pemilik kanal maupun anggota grup sesuai hak akses yang diberikan.
- Menyediakan interaksi bagi penonton kepada *content creator* melalui fitur komentar, *like* serta *dislike*.
- Menyediakan fitur pengaturan hak akses pengguna kanal grup: *Manager*, *Editor*, *Subtitle Editor*, dan *Viewer*, untuk mensimulasikan kolaborasi dalam pengelolaan kanal.
- Menyediakan basis data yang mengelola pengguna, kanal, konten video seperti *upload*, *view*, *subscribe/unsubscribe*, *like/dislike*, dan komentar.
- Menyediakan *dashboard* untuk menampilkan performa (data analisis video) seperti jumlah *view*, waktu tonton, komentar, dan jumlah *like/dislike*.

## II. Perencanaan Pekerjaan, Organisasi, dan Jadwal

### 2.1 Gambar Lengkap WBS

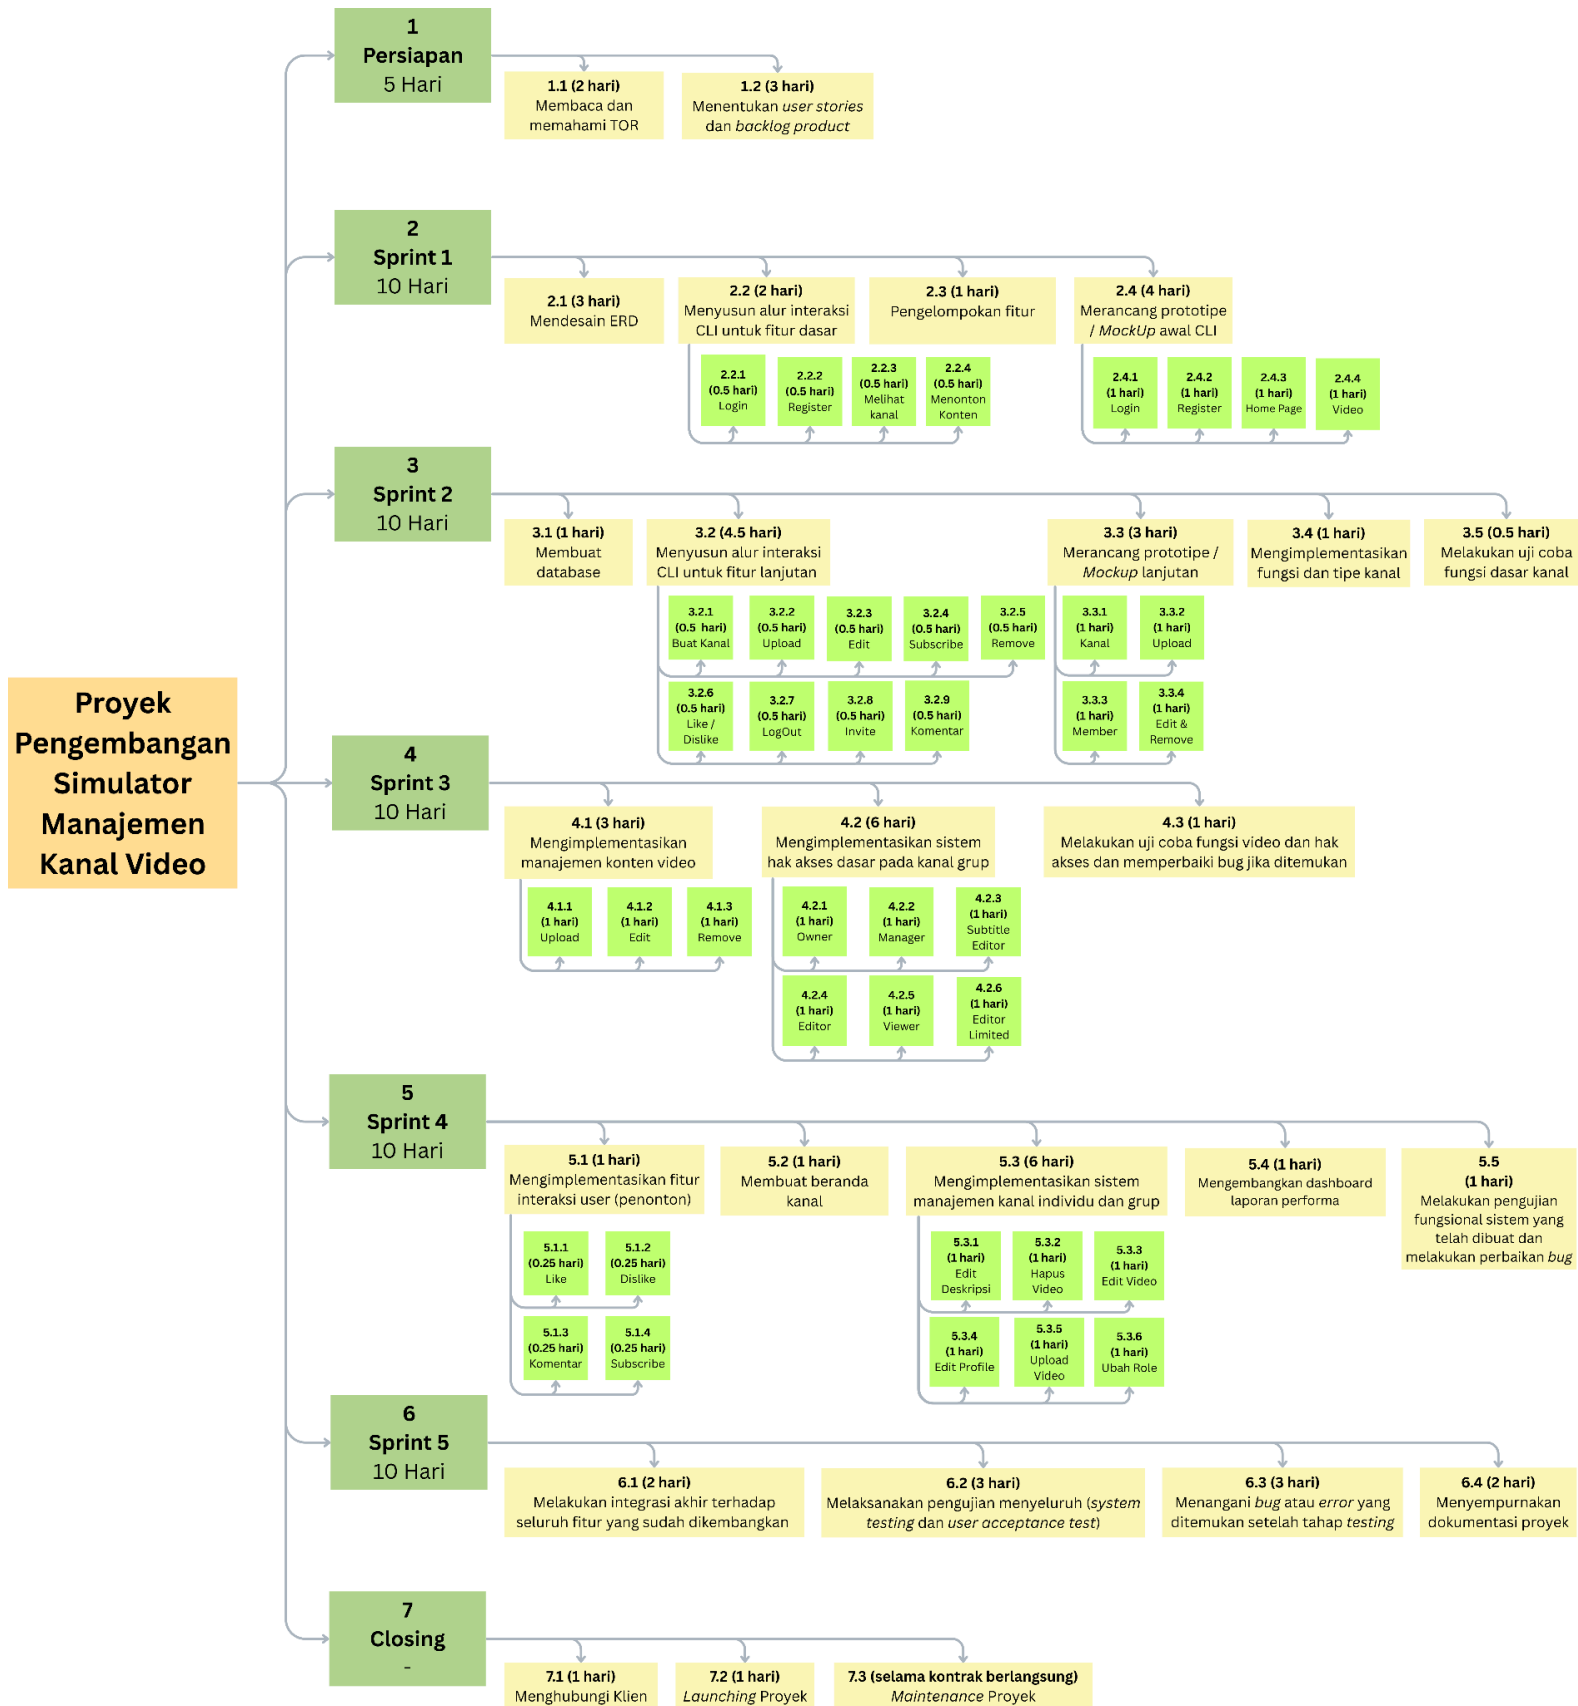

## 2.2. Deskripsi Tiap Work-Package

|                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 1.1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nama paket               | Membaca dan memahami TOR                                                                                                                                                                                                                |
| Deskripsi                | Mempelajari secara menyeluruh dokumen <i>Terms of Reference</i> (TOR) yang disediakan oleh pihak pemberi proyek agar seluruh anggota tim memahami konteks, ruang lingkup, kebutuhan, tujuan, dan batasan proyek yang akan dilaksanakan. |
| SDM                      | Seluruh anggota tim                                                                                                                                                                                                                     |
| Durasi (lama dikerjakan) | 2 Hari                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alat                     | 10 Komputer atau Laptop                                                                                                                                                                                                                 |
| Presedence               | -                                                                                                                                                                                                                                       |

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 1.2                                                                                                                                                                             |
| Nama paket               | Menentukan User Stories dan Backlog product                                                                                                                                     |
| Deskripsi                | Mengidentifikasi, mendefinisikan, dan memprioritaskan <i>user stories</i> berdasarkan kebutuhan pengguna dan tujuan proyek, serta menyusunnya ke dalam <i>product backlog</i> . |
| SDM                      | Seluruh anggota tim                                                                                                                                                             |
| Durasi (lama dikerjakan) | 3 Hari                                                                                                                                                                          |
| Alat                     | ± 10 lembar Kertas A4 / ± 70 lembar Sticky notes dan 5 pena                                                                                                                     |
| Presedence               | 1.1                                                                                                                                                                             |

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.1                                                                                       |
| Nama paket               | Mendesain ERD                                                                             |
| Deskripsi                | Perancangan <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) sebagai model konseptual basis data. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dengan pemahaman terkait ERD dan 1 Database Engineer                  |
| Durasi (lama dikerjakan) | 3 hari                                                                                    |
| Alat                     | 2 software Astah dan 2 komputer                                                           |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                  |

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.2.1                                                                                                                                  |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur <i>Login</i>                                                                                   |
| Deskripsi                | Merancang alur <i>login</i> berbasis CLI dengan menentukan input ( <i>username</i> , <i>password</i> ), validasi, serta respon sistem. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                                                                               |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 hari                                                                                                                               |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                                                  |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                                               |

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.2.2                                                                                                               |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Register                                                                    |
| Deskripsi                | Merancang alur registrasi berbasis CLI dengan menentukan input (username, password), validasi, serta respon sistem. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                                                            |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 hari                                                                                                            |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                               |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                            |

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.2.3                                                                                            |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Melihat Kanal                                            |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI untuk menampilkan halaman awal kanal dan konten kanal yang dipilih. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                                         |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 hari                                                                                         |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                            |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                         |

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.2.4                                                                                                                                       |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Menonton Konten                                                                                     |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI pengguna untuk memilih konten, menampilkan detail konten, memutar, menghentikan, atau keluar dari mode tonton. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                                                                                    |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 hari                                                                                                                                    |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                                                       |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                                                    |

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.3                                                           |
| Nama paket               | Melakukan Pengelompokan Fitur                                 |
| Deskripsi                | Mengelompokkan fitur sistem ke dalam beberapa kategori utama. |
| SDM                      | 1 Scrum Master dan 1 System Analyst                           |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 hari                                                        |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                         |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                      |

|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.4.1                                                                                                                                 |
| Nama paket               | Merancang prototipe awal Login                                                                                                        |
| Deskripsi                | Membuat rancangan prototipe awal fitur login berbasis CLI untuk memvisualisasikan proses login sebelum implementasi teknis dilakukan. |
| SDM                      | 1 UI/UX Designer dan 1 System Analyst                                                                                                 |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 hari                                                                                                                                |
| Alat                     | 1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer                                                                               |
| Presedence               | 2.2.1                                                                                                                                 |

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.4.2                                                                                                                                           |
| Nama paket               | Merancang prototipe awal Register                                                                                                               |
| Deskripsi                | Membuat rancangan prototipe awal fitur registrasi berbasis CLI untuk memvisualisasikan proses registrasi sebelum implementasi teknis dilakukan. |
| SDM                      | 1 UI/UX Designer dan 1 System Analyst                                                                                                           |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 hari                                                                                                                                          |
| Alat                     | 1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer                                                                                         |
| Presedence               | 2.2.2                                                                                                                                           |

|                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.4.3                                                                                                                                                                                                  |
| Nama paket               | Merancang prototipe awal Home Page / Beranda                                                                                                                                                           |
| Deskripsi                | Membuat prototipe awal halaman beranda berbasis CLI yang menampilkan menu utama (misalnya login, register, melihat kanal, menonton konten) sebagai gambaran awal navigasi sistem sebelum implementasi. |
| SDM                      | 1 UI/UX Designer dan 1 System Analyst                                                                                                                                                                  |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 hari                                                                                                                                                                                                 |
| Alat                     | 1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer                                                                                                                                                |
| Presedence               | 2.2.3                                                                                                                                                                                                  |

|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 2.4.4                                                                                                                                                                                      |
| Nama paket               | Merancang prototipe awal video                                                                                                                                                             |
| Deskripsi                | Membuat prototipe awal tampilan video berbasis CLI yang menampilkan judul, deskripsi, opsi play/pause/stop, serta navigasi sederhana sebagai simulasi fitur menonton sebelum implementasi. |
| SDM                      | 1 UI/UX Designer dan 1 System Analyst                                                                                                                                                      |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 hari                                                                                                                                                                                     |
| Alat                     | 1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer                                                                                                                                    |
| Presedence               | 2.2.4                                                                                                                                                                                      |

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.1                                                                                                                                                            |
| Nama paket               | Membuat database                                                                                                                                               |
| Deskripsi                | Membangun basis data sesuai rancangan ERD, meliputi pembuatan tabel, relasi, dan constraint agar sistem dapat menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. |
| SDM                      | 1 Database Engineer dan 1 Backend Developer                                                                                                                    |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                                                                         |
| Alat                     | 2 SQL Server Management Studio, 2 komputer                                                                                                                     |
| Presedence               | 2.1                                                                                                                                                            |

|                          |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.2.1                                                                                                                                                                                                         |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk membuat kanal                                                                                                                                                               |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna membuat kanal baru dengan input (nama, deskripsi, website, jenis), validasi data, serta menampilkan respon sistem sebagai acuan sebelum implementasi. |
| SDM                      | 1 System Analyst dan 1 Backend Developer                                                                                                                                                                      |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                                                                                                                                                      |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                                                                                                                         |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                                                                                                                      |

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.2.2                                                                                                            |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk upload                                                                         |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna mengunggah konten dengan input (judul, deskripsi, file). |
| SDM                      | 1 System Analyst dan 1 Backend Developer                                                                         |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                                                         |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                            |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                         |

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.2.3                                                                                                               |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk edit konten                                                                       |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna memilih konten, melakukan perubahan (judul atau deskripsi). |
| SDM                      | 1 System Analyst dan 1 Backend Developer                                                                            |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                                                            |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                               |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                            |



|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.2.4                                                                                                        |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk subscribe                                                                  |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna memilih kanal, melakukan aksi subscribe/unsubscribe. |
| SDM                      | 1 System Analyst dan 1 Backend Developer                                                                     |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                                                     |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                        |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.2.5                                                                                                                                                                                                                  |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk remove video                                                                                                                                                                         |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna memilih video yang ingin dihapus, menampilkan konfirmasi, memproses penghapusan, serta memberikan respon sistem sebagai acuan implementasi fitur remove video. |
| SDM                      | 1 System Analyst dan 1 Backend Developer                                                                                                                                                                               |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                                                                                                                                                               |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                                                                                                                                  |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                                                                                                                               |

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.2.6                                                                                                                                             |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk like dan dislike                                                                                                |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna memberi like atau dislike pada konten, memvalidasi aksi, serta menampilkan respon sistem. |
| SDM                      | 1 System Analyst dan 1 Backend Developer                                                                                                          |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                                                                                          |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                                                             |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                                                          |

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.2.7                                                                          |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk logout                                       |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna keluar dari sesi akun. |
| SDM                      | 1 System Analyst dan 1 Backend Developer                                       |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                       |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                          |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                       |

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.2.8                                                                                                                                  |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk invite role                                                                                          |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna dengan hak tertentu mengundang akun lain ke dalam kanal dengan peran tertentu. |
| SDM                      | 1 System Analyst dan 1 Backend Developer                                                                                               |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                                                                               |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                                                                  |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                                                               |

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.2.9                                                                                     |
| Nama paket               | Menyusun alur interaksi CLI untuk komentar                                                |
| Deskripsi                | Merancang alur interaksi CLI yang memungkinkan pengguna menambahkan komentar pada konten. |
| SDM                      | 1 System Analyst dan 1 Backend Developer                                                  |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                                  |
| Alat                     | 2 software Text Editor dan 2 komputer                                                     |
| Presedence               | 1.1, 1.2                                                                                  |

|                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.3.1                                                                                                                                                                                                  |
| Nama paket               | Merancang protitipe kanal                                                                                                                                                                              |
| Deskripsi                | Membuat prototipe tampilan halaman kanal berbasis CLI untuk pembuat kanal dan user yang menampilkan nama, deskripsi, dan konten yang dimiliki sebagai gambaran awal sebelum tahap implementasi teknis. |
| SDM                      | 1 UI/UX Designer dan 1 Backend Developer                                                                                                                                                               |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                                                                                                                 |
| Alat                     | 1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer                                                                                                                                                |
| Presedence               | 2.2.3, 3.2.1                                                                                                                                                                                           |

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.3.2                                                                                                                                                    |
| Nama paket               | Merancang protitipe upload                                                                                                                               |
| Deskripsi                | Membuat prototipe fitur upload berbasis CLI untuk mensimulasikan proses unggah konten, mulai dari input judul, deskripsi, dan file hingga respon sistem. |
| SDM                      | 1 UI/UX Designer dan 1 Backend Developer                                                                                                                 |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                                                                   |
| Alat                     | 1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer                                                                                                  |
| Presedence               | 3.2.2                                                                                                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.3.3                                                                                                                                                                            |
| Nama paket               | Merancang prototipe member                                                                                                                                                       |
| Deskripsi                | Membuat prototipe awal fitur daftar member kanal berbasis CLI yang menampilkan alur untuk melihat anggota, peran, serta opsi dasar sebagai simulasi sebelum implementasi teknis. |
| SDM                      | 1 UI/UX Designer dan 1 Backend Developer                                                                                                                                         |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                                                                                           |
| Alat                     | 1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer                                                                                                                          |
| Presedence               | 3.2.1, 3.2.8                                                                                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.3.4                                                                                                                                                       |
| Nama paket               | Merancang prototipe edit dan remove video                                                                                                                   |
| Deskripsi                | Membuat prototipe awal fitur edit dan remove video berbasis CLI yang menampilkan alur untuk mengedit deskripsi dan judul video serta melakukan remove video |
| SDM                      | 1 UI/UX Designer dan 1 Backend Developer                                                                                                                    |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                                                                      |
| Alat                     | 1 software Text Editor, 1 software Astah dan 2 komputer                                                                                                     |
| Presedence               | 3.2.3, 3.2.5                                                                                                                                                |

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.4                                                                                         |
| Nama paket               | Melakukan implementasi fungsi dan tipe kanal                                                |
| Deskripsi                | Melakukan Coding untuk fitur user agar dapat memilih membuat kanal individu atau kanal grup |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                 |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                      |
| Alat                     | 1 software IDE Java, SQL Server, dan 2 komputer                                             |
| Presedence               | 3.1, 3.3.1                                                                                  |

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 3.5                                                                                                                                                                                |
| Nama paket               | Melakukan ujicoba fungsi dasar kanal                                                                                                                                               |
| Deskripsi                | Melakukan pengujian fitur dasar kanal seperti membuat kanal, melihat kanal, dan mengatur tipe kanal untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari error kritis. |
| SDM                      | 3 QA Tester dan 1 Backend Developer                                                                                                                                                |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Hari                                                                                                                                                                           |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text editor dan 5 komputer                                                                                                                    |
| Presedence               | 3.4                                                                                                                                                                                |

|                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.1.1                                                                                                                                                                                                  |
| Nama paket               | Mengimplementasikan manajemen upload video                                                                                                                                                             |
| Deskripsi                | Mengembangkan fitur manajemen upload video yang mencakup proses penyimpanan metadata (judul, deskripsi, pemilik), serta integrasi dengan database agar konten dapat dikelola dan diakses dalam sistem. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                                                                                                                            |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                                                                                                                 |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                                                                                                                                      |
| Presedence               | 3.1, 3.3.2                                                                                                                                                                                             |

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.1.2                                                                                                                                                                           |
| Nama paket               | Mengimplementasikan manajemen edit video                                                                                                                                        |
| Deskripsi                | Mengembangkan fitur manajemen edit video yang memungkinkan pengguna memperbarui metadata (judul atau deskripsi), memvalidasi perubahan, serta menyimpan hasil edit ke database. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                                                                                                     |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                                                                                          |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                                                                                                               |
| Presedence               | 3.1, 3.3.4                                                                                                                                                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.1.3                                                                                                                                                                                                  |
| Nama paket               | Mengimplementasikan manajemen remove video                                                                                                                                                             |
| Deskripsi                | Mengembangkan fitur manajemen penghapusan video yang memungkinkan pengguna memilih konten, melakukan konfirmasi, menghapus data dari database, serta memastikan integritas sistem setelah penghapusan. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                                                                                                                            |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                                                                                                                 |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                                                                                                                                      |
| Presedence               | 3.1, 3.3.4                                                                                                                                                                                             |

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.2.1                                                                            |
| Nama paket               | Menerapkan sistem hak akses owner                                                |
| Deskripsi                | Mengatur hak akses khusus owner agar dapat mengelola fitur dan data secara penuh |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                         |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                           |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                |
| Presedence               | 3.1, 3.3.1, 3.3.3                                                                |

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.2.2                                                                                |
| Nama paket               | Menerapkan sistem hak akses manager                                                  |
| Deskripsi                | Mengatur hak akses manager agar dapat memantau dan mengelola data sesuai kewenangan. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                             |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                               |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                    |
| Presedence               | 3.1, 3.3.1, 3.3.3                                                                    |

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.2.3                                                                                     |
| Nama paket               | Menerapkan sistem hak akses subtitle editor                                               |
| Deskripsi                | Mengatur hak akses subtitle editor agar dapat menambah, mengubah, dan menghapus subtitle. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                                  |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                    |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                         |
| Presedence               | 3.1, 3.3.1, 3.3.3                                                                         |

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.2.4                                                                         |
| Nama paket               | Menerapkan sistem hak akses editor                                            |
| Deskripsi                | Mengatur hak akses editor agar dapat membuat, mengubah, dan menghapus konten. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                      |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                        |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                             |
| Presedence               | 3.1, 3.3.1, 3.3.3                                                             |

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.2.5                                                                          |
| Nama paket               | Menerapkan sistem hak akses viewer                                             |
| Deskripsi                | Mengatur hak akses viewer agar hanya dapat melihat konten tanpa mengubah data. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                       |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                         |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                              |
| Presedence               | 3.1, 3.3.1, 3.3.3                                                              |

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.2.6                                                                                    |
| Nama paket               | Menerapkan sistem hak akses editor limited                                               |
| Deskripsi                | Mengatur hak akses editor terbatas agar hanya bisa mengubah konten tertentu sesuai izin. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 System Analyst                                                 |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                   |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                        |
| Presedence               | 3.1, 3.3.1, 3.3.3                                                                        |

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 4.3                                                                                                |
| Nama paket               | Melakukan uji coba fungsi video dan hak akses                                                      |
| Deskripsi                | Menguji pemutaran video serta pengaturan hak akses untuk memastikan fungsi berjalan sesuai aturan. |
| SDM                      | 3 QA Tester dan 1 Backend Developer                                                                |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                             |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text editor dan 4 komputer                                    |
| Presedence               | 4.1 (Seluruhnya), 4.2 (Seluruhnya)                                                                 |

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.1.1                                                                 |
| Nama paket               | Mengimplementasikan fitur like                                        |
| Deskripsi                | Membuat fungsi untuk menambahkan tanda like pada video oleh pengguna. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                           |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.25 Hari                                                             |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                     |
| Presedence               | 2.4.4, 3.1                                                            |

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.1.2                                                                       |
| Nama paket               | Mengimplementasikan fitur dislike                                           |
| Deskripsi                | Membuat fungsi untuk menambahkan tanda tidak suka pada video oleh pengguna. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                 |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.25 Hari                                                                   |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                           |
| Presedence               | 2.4.4, 3.1                                                                  |

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.1.3                                                                                    |
| Nama paket               | Mengimplementasikan fitur komentar                                                       |
| Deskripsi                | Membuat sistem komentar agar pengguna dapat menambahkan dan membaca komentar pada video. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                              |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.25 Hari                                                                                |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                        |
| Presedence               | 2.4.4, 3.1                                                                               |

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.1.4                                                                                   |
| Nama paket               | Mengimplementasikan fitur subscribe                                                     |
| Deskripsi                | Mengembangkan fitur subscribe/unsubscribe agar pengguna dapat mengikuti kanal tertentu. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                             |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.25 Hari                                                                               |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                       |
| Presedence               | 2.4.4, 3.1                                                                              |

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.2                                                                                               |
| Nama paket               | Membuat beranda kanal                                                                             |
| Deskripsi                | Membuat halaman beranda kanal yang menampilkan daftar video, profil kanal, dan statistik ringkas. |
| SDM                      | 1 UI/UX Designer dan 1 Frontend Developer                                                         |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                            |
| Alat                     | 2 software IDE Java dan 2 komputer                                                                |
| Presedence               | 3.3.1                                                                                             |

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.3.1                                                                                     |
| Nama paket               | Mengimplementasikan sistem edit deskripsi pada kanal individu dan grup                    |
| Deskripsi                | Menyediakan fitur untuk mengubah deskripsi kanal individu sesuai kebutuhan pemilik kanal. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                               |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                    |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                         |
| Presedence               | 3.1, 3.4, 5.2                                                                             |

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.3.2                                                               |
| Nama paket               | Mengimplementasikan sistem hapus video pada kanal individu dan grup |
| Deskripsi                | Membuat fitur menghapus video dari kanal individu.                  |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                         |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                              |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                   |
| Presedence               | 3.1, 3.4, 5.2                                                       |

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.3.3                                                                             |
| Nama paket               | Mengimplementasikan sistem edit video pada kanal individu dan grup                |
| Deskripsi                | Membuat fitur untuk mengubah detail video (judul, deskripsi) pada kanal individu. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                       |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                            |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                 |
| Presedence               | 3.1, 3.4, 5.2                                                                     |

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.3.4                                                                                      |
| Nama paket               | Mengimplementasikan sistem edit profile pada kanal individu dan grup                       |
| Deskripsi                | Menyediakan fitur untuk mengubah profil kanal individu seperti nama kanal dan foto profil. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                     |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                          |
| Presedence               | 3.1, 3.4, 5.2                                                                              |

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.3.5                                                                                             |
| Nama paket               | Mengimplementasikan sistem upload video pada kanal individu dan grup                              |
| Deskripsi                | Mengembangkan fitur untuk mengunggah video baru ke kanal individu dan menyimpannya di basis data. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                       |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                            |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                                 |
| Presedence               | 3.1, 3.4, 5.2                                                                                     |



|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.3.6                                                                                                 |
| Nama paket               | Mengimplementasikan sistem ubah role pada kanal grup saja                                             |
| Deskripsi                | Membangun fitur untuk memungkinkan pemilik kanal atau manajer mengubah peran anggota dalam kanal grup |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                           |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                                     |
| Presedence               | 3.1, 3.4, 5.2                                                                                         |

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.4                                                                                                                                     |
| Nama paket               | Mengembangkan dashboard laporan performa                                                                                                |
| Deskripsi                | Membuat fitur dashboard yang menampilkan data analitik, seperti jumlah view, waktu tonton, komentar, like/dislike, serta video populer. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                                                             |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                                                  |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, dan 2 komputer                                                                                       |
| Presedence               | 5.2                                                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 5.5                                                                                                             |
| Nama paket               | Melakukan pengujian fungsional sistem yang telah dibuat dan melakukan perbaikan bug                             |
| Deskripsi                | Melakukan uji coba fungsional setiap fitur yang telah dikembangkan, serta memperbaiki bug/error yang ditemukan. |
| SDM                      | 3 QA Tester, 1 Backend Developer, dan 1 Database Engineer                                                       |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                                          |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text editor dan 5 komputer                                                 |
| Presedence               | 5.1, 5.3, 5.4                                                                                                   |

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 6.1                                                                                                     |
| Nama paket               | Melakukan integrasi akhir terhadap seluruh fitur yang sudah dikembangkan                                |
| Deskripsi                | Menggabungkan seluruh fitur(kanal, video, interaksi, analitik) agar berfungsi sebagai satu sistem utuh. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                             |
| Durasi (lama dikerjakan) | 2 Hari                                                                                                  |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer                                                           |
| Presedence               | 3.5, 4.3, 5.5                                                                                           |

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 6.2                                                                                                                  |
| Nama paket               | Melaksanakan pengujian menyeluruh (system testing dan user acceptance test)                                          |
| Deskripsi                | Menguji sistem secara menyeluruh, baik secara teknis (system testing) maupun dengan melibatkan pengguna akhir (UAT). |
| SDM                      | 3 QA Tester dan 1 Backend Developer                                                                                  |
| Durasi (lama dikerjakan) | 3 Hari                                                                                                               |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, dan 4 komputer                                                     |
| Presedence               | 6.1                                                                                                                  |

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 6.3                                                                                          |
| Nama paket               | Menangani bug atau error yang ditemukan setelah tahap testing                                |
| Deskripsi                | Melakukan perbaikan terhadap bug/error yang terdeteksi pada tahap system testing maupun UAT. |
| SDM                      | 1 Backend Developer dan 1 Database Engineer                                                  |
| Durasi (lama dikerjakan) | 3 Hari                                                                                       |
| Alat                     | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, dan 2 komputer                             |
| Presedence               | 6.2                                                                                          |

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 6.4                                                                                               |
| Nama paket               | Menyempurnakan dokumentasi proyek                                                                 |
| Deskripsi                | Menyusun dokumentasi teknis, panduan penggunaan sistem (user manual), serta laporan akhir proyek. |
| SDM                      | Scrum Master                                                                                      |
| Durasi (lama dikerjakan) | 2 Hari                                                                                            |
| Alat                     | 1 software Text Editor dan 1 komputer                                                             |
| Presedence               | 6.1                                                                                               |

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 7.1                                                                                           |
| Nama paket               | Contact Klien                                                                                 |
| Deskripsi                | Scrum Master melakukan komunikasi dengan client untuk menginfokan bahwa proyek sudah selesai. |
| SDM                      | Scrum Master                                                                                  |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                                                        |
| Alat                     | 1 Handphone / Komputer, Email, Chat Messenger                                                 |
| Presedence               | 6.3 dan 6.4                                                                                   |

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nomor paket              | 7.2                                                   |
| Nama paket               | Launching Proyek                                      |
| Deskripsi                | Tim Developer dan client melakukan peluncuran proyek. |
| SDM                      | Scrum Master                                          |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Hari                                                |
| Alat                     | -                                                     |
| Presedence               | 7.1                                                   |

### 2.3. Ringkasan Work Package dan Jaringan Pekerjaan

#### Ringkasan Work Package:

| No. Paket | Nama Paket                                              | Presedence | Durasi   | SDM                                      | Alat                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1       | Membaca dan memahami TOR                                | -          | 2 Hari   | Seluruh anggota tim                      | 10 Laptop / Komputer                                        |
| 1.2       | Menentukan User Stories dan Backlog product             | 1.1        | 3 Hari   | Seluruh anggota tim                      | ± 10 lembar Kertas A4 /<br>± 70 lembar Sticky notes, 5 pena |
| 2.1       | Mendesain ERD                                           | 1.1, 1.2   | 3 Hari   | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 2 software Astah, 2 komputer                                |
| 2.2.1     | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Login           | 1.1, 1.2   | 0.5 Hari | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 2 software Text Editor, 2 komputer                          |
| 2.2.2     | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Register        | 1.1, 1.2   | 0.5 Hari | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 2 software Text Editor, 2 komputer                          |
| 2.2.3     | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Melihat Kanal   | 1.1, 1.2   | 0.5 Hari | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 2 software Text Editor, 2 komputer                          |
| 2.2.4     | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Menonton Konten | 1.1, 1.2   | 0.5 Hari | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 2 software Text Editor, 2 komputer                          |

|       |                                                 |          |          |                                          |                                                      |
|-------|-------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2.3   | Melakukan Pengelompokan Fitur                   | 1.1, 1.2 | 1 Hari   | 1 Scrum Master, 1 System Analyst         | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |
| 2.4.1 | Merancang prototipe awal Login                  | 2.2.1    | 1 Hari   | 1 UI/UX Designer, 1 System Analyst       | 1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer |
| 2.4.2 | Merancang prototipe awal Register               | 2.2.2    | 1 Hari   | 1 UI/UX Designer, 1 System Analyst       | 1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer |
| 2.4.3 | Merancang prototipe awal Home Page              | 2.2.3    | 1 Hari   | 1 UI/UX Designer, 1 System Analyst       | 1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer |
| 2.4.4 | Merancang prototipe awal Video                  | 2.2.4    | 1 Hari   | 1 UI/UX Designer, 1 System Analyst       | 1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer |
| 3.1   | Membuat Database                                | 2.1      | 1 Hari   | 1 Database Engineer, 1 Backend Developer | 2 SQL Server Management Studio, 2 komputer           |
| 3.2.1 | Menyusun alur interaksi CLI untuk membuat kanal | 1.1, 1.2 | 0.5 Hari | 1 System Analyst, 1 Backend Developer    | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |
| 3.2.2 | Menyusun alur interaksi CLI untuk upload        | 1.1, 1.2 | 0.5 Hari | 1 System Analyst, 1 Backend Developer    | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |
| 3.2.3 | Menyusun alur interaksi CLI untuk edit konten   | 1.1, 1.2 | 0.5 Hari | 1 System Analyst, 1 Backend Developer    | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |
| 3.2.4 | Menyusun alur interaksi CLI untuk subscribe     | 1.1, 1.2 | 0.5 Hari | 1 System Analyst, 1 Backend Developer    | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |
| 3.2.5 | Menyusun alur interaksi CLI untuk remove video  | 1.1, 1.2 | 0.5 Hari | 1 System Analyst, 1 Backend Developer    | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |

|       |                                                    |              |          |                                          |                                                      |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3.2.6 | Menyusun alur interaksi CLI untuk like dan dislike | 1.1, 1.2     | 0.5 Hari | 1 System Analyst, 1 Backend Developer    | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |
| 3.2.7 | Menyusun alur interaksi CLI untuk logout           | 1.1, 1.2     | 0.5 Hari | 1 System Analyst, 1 Backend Developer    | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |
| 3.2.8 | Menyusun alur interaksi CLI untuk invite role      | 1.1, 1.2     | 0.5 Hari | 1 System Analyst, 1 Backend Developer    | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |
| 3.2.9 | Menyusun alur interaksi CLI untuk komentar         | 1.1, 1.2     | 0.5 Hari | 1 System Analyst, 1 Backend Developer    | 2 software Text Editor, 2 komputer                   |
| 3.3.1 | Merancang prototipe Kanal                          | 2.2.3, 3.2.1 | 1 Hari   | 1 UI/UX Designer, 1 Backend Developer    | 1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer |
| 3.3.2 | Merancang prototipe Upload                         | 3.2.2        | 1 Hari   | 1 UI/UX Designer, 1 Backend Developer    | 1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer |
| 3.3.3 | Merancang prototipe Member                         | 3.2.1, 3.2.8 | 1 Hari   | 1 UI/UX Designer, 1 Backend Developer    | 1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer |
| 3.3.4 | Merancang prototipe Edit & Remove Video            | 3.2.3, 3.2.5 | 1 Hari   | 1 UI/UX Designer, 1 Backend Developer    | 1 software Text Editor, 1 software Astah, 2 komputer |
| 3.4   | Implementasi fungsi & tipe kanal                   | 3.1, 3.3.1   | 1 Hari   | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer        |
| 3.5   | Uji coba fungsi dasar kanal                        | 3.4          | 0.5 Hari | 3 QA Tester, 1 Backend Developer         | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 4 komputer        |


|       |                                     |                   |           |                                          |                                               |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4.1.1 | Implementasi manajemen upload video | 3.1, 3.3.2        | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 4.1.2 | Implementasi manajemen edit video   | 3.1, 3.3.4        | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 4.1.3 | Implementasi manajemen remove video | 3.1, 3.3.4        | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 4.2.1 | Sistem hak akses Owner              | 3.1, 3.3.1, 3.3.3 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 4.2.2 | Sistem hak akses Manager            | 3.1, 3.3.1, 3.3.3 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 4.2.3 | Sistem hak akses Subtitle Editor    | 3.1, 3.3.1, 3.3.3 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 4.2.4 | Sistem hak akses Editor             | 3.1, 3.3.1, 3.3.3 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 4.2.5 | Sistem hak akses Viewer             | 3.1, 3.3.1, 3.3.3 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 4.2.6 | Sistem hak akses Editor Limited     | 3.1, 3.3.1, 3.3.3 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 System Analyst    | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 4.3   | Uji coba fungsi video & hak akses   | 4.1, 4.2          | 1 Hari    | 3 QA Tester, 1 Backend Developer         | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 4 komputer |
| 5.1.1 | Implementasi fitur Like             | 2.4.4, 3.1        | 0.25 Hari | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 5.1.2 | Implementasi fitur Dislike          | 2.4.4, 3.1        | 0.25 Hari | 1 Backend Developer, 1                   | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |


|       |                                        |               |           |                                          |                                               |
|-------|----------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                        |               |           | Database Engineer                        |                                               |
| 5.1.3 | Implementasi fitur Komentar            | 2.4.4, 3.1    | 0.25 Hari | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 5.1.4 | Implementasi fitur Subscribe           | 2.4.4, 3.1    | 0.25 Hari | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 5.2   | Membuat beranda kanal                  | 3.3.1         | 1 Hari    | 1 UI/UX Designer, 1 Frontend Developer   | 2 software IDE Java, 2 komputer               |
| 5.3.1 | Edit deskripsi kanal individu & grup   | 3.1, 3.4, 5.2 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 5.3.2 | Hapus video pada kanal individu & grup | 3.1, 3.4, 5.2 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 5.3.3 | Edit video pada kanal individu & grup  | 3.1, 3.4, 5.2 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 5.3.4 | Edit profil kanal individu & grup      | 3.1, 3.4, 5.2 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 5.3.5 | Upload video kanal individu & grup     | 3.1, 3.4, 5.2 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |
| 5.3.6 | Ubah role pada kanal grup              | 3.1, 3.4, 5.2 | 1 Hari    | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer |


|     |                                             |               |        |                                                       |                                                              |
|-----|---------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5.4 | Dashboard laporan performa                  | 5.2           | 1 Hari | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer              | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer                |
| 5.5 | Pengujian fungsional sistem & perbaikan bug | 5.1, 5.3, 5.4 | 1 Hari | 3 QA Tester, 1 Backend Developer, 1 Database Engineer | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, 5 komputer |
| 6.1 | Integrasi akhir seluruh fitur               | 3.5, 4.3, 5.5 | 2 Hari | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer              | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 2 komputer                |
| 6.2 | System testing & UAT                        | 6.1           | 3 Hari | 3 QA Tester, 1 Backend Developer                      | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, 4 komputer |
| 6.3 | Menangani bug setelah testing               | 6.2           | 3 Hari | 1 Backend Developer, 1 Database Engineer              | 1 software IDE Java, 1 SQL Server, 1 Text Editor, 2 komputer |
| 6.4 | Dokumentasi proyek                          | 6.1           | 2 Hari | Scrum Master                                          | 1 software Text Editor, 1 komputer                           |
| 7.1 | Contact Klien                               | 6.3, 6.4      | 1 Hari | Scrum Master                                          | 1 Handphone / Komputer, Email, Chat Messenger                |
| 7.2 | Launching Proyek                            | 7.1           | 1 Hari | Scrum Master                                          | -                                                            |




### Gambar Jaringan Pekerjaan:

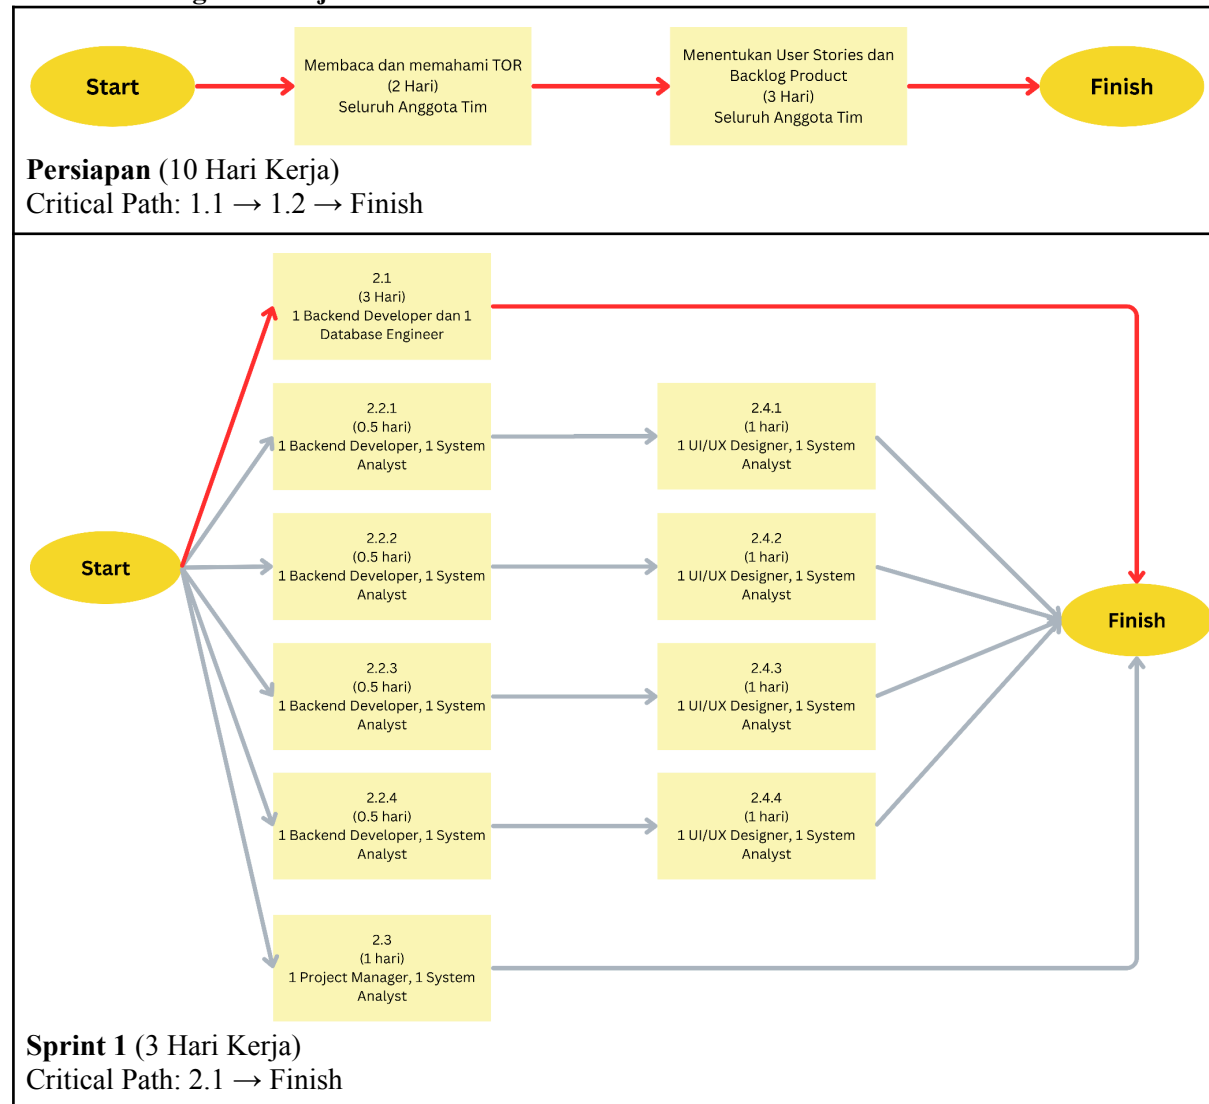

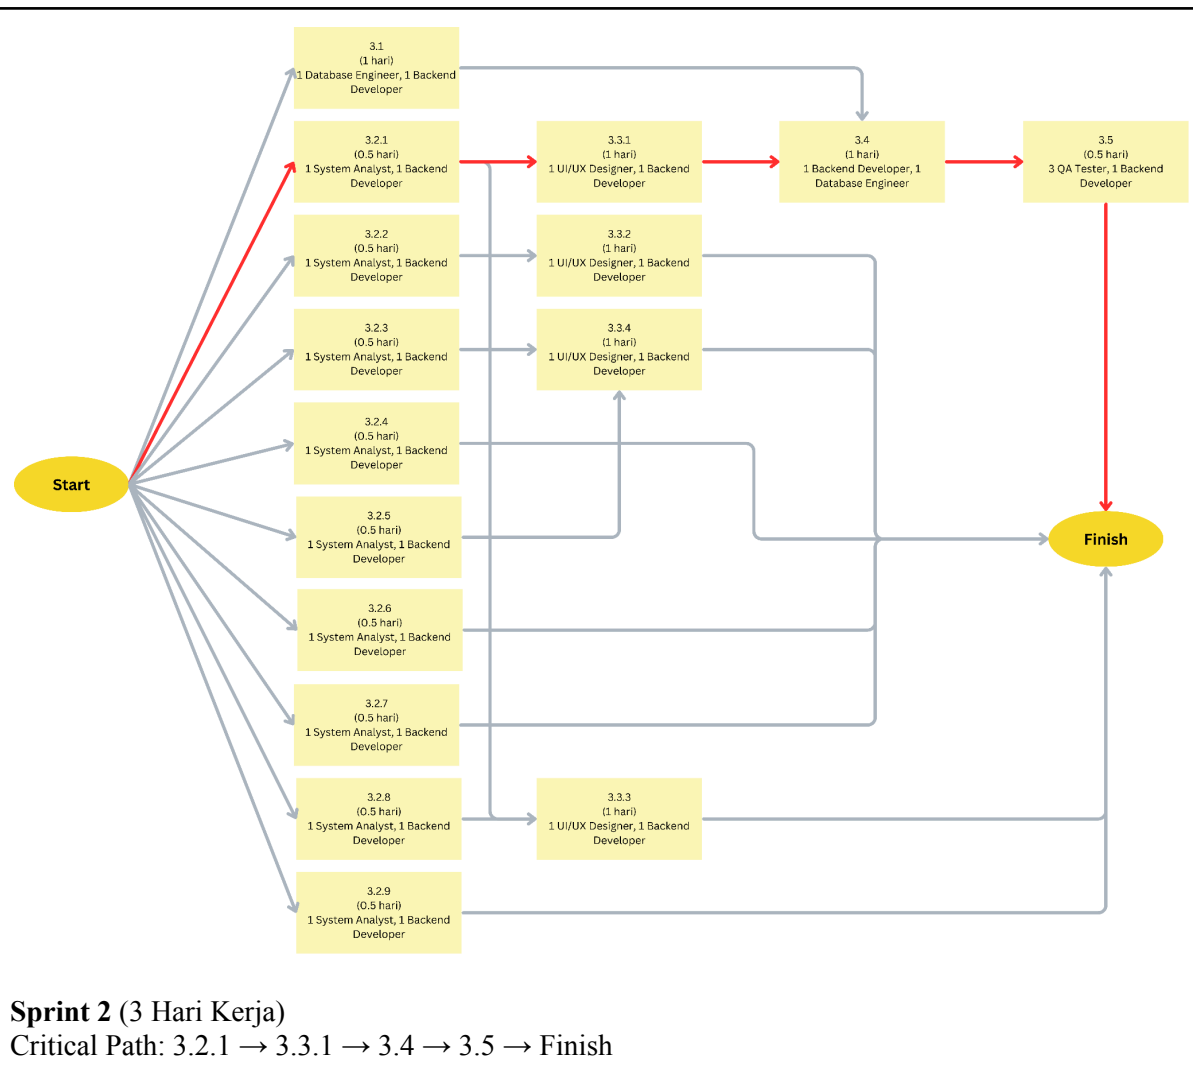


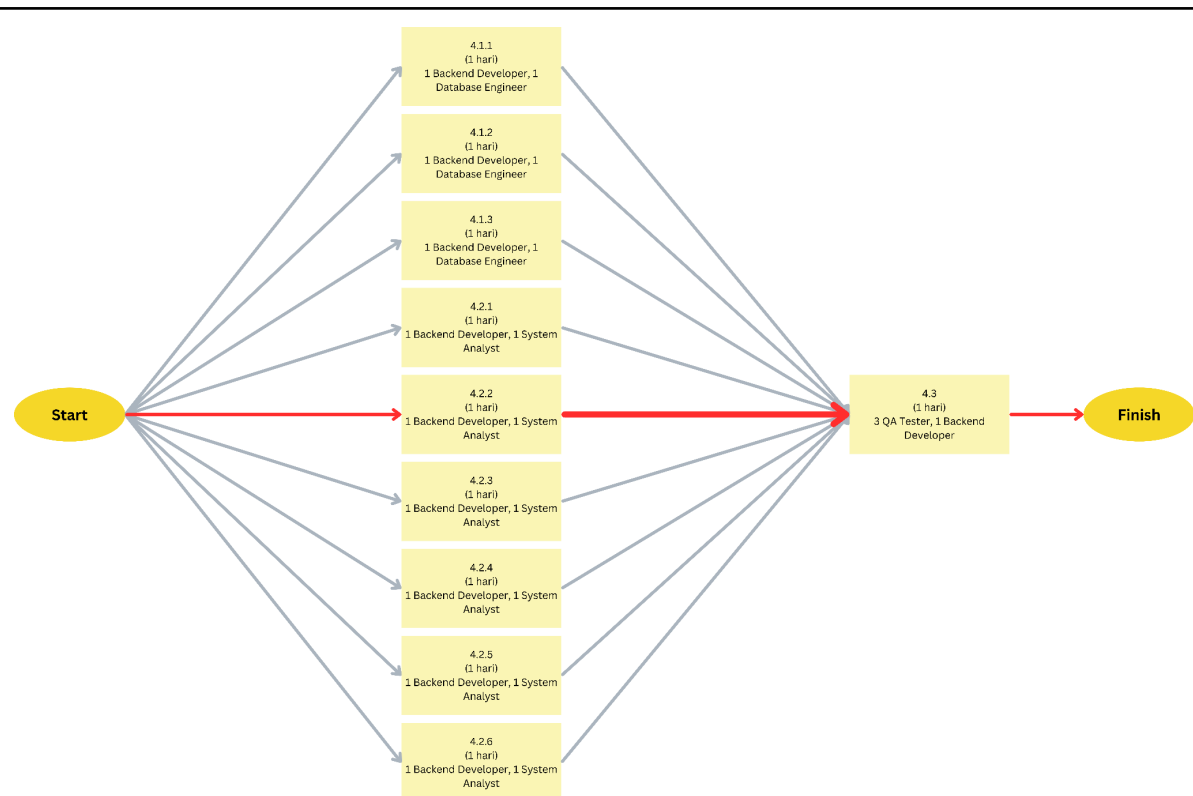

**Sprint 3** (2 Hari kerja)  
Critical Path: 4.2.2 → 4.3 → Finish

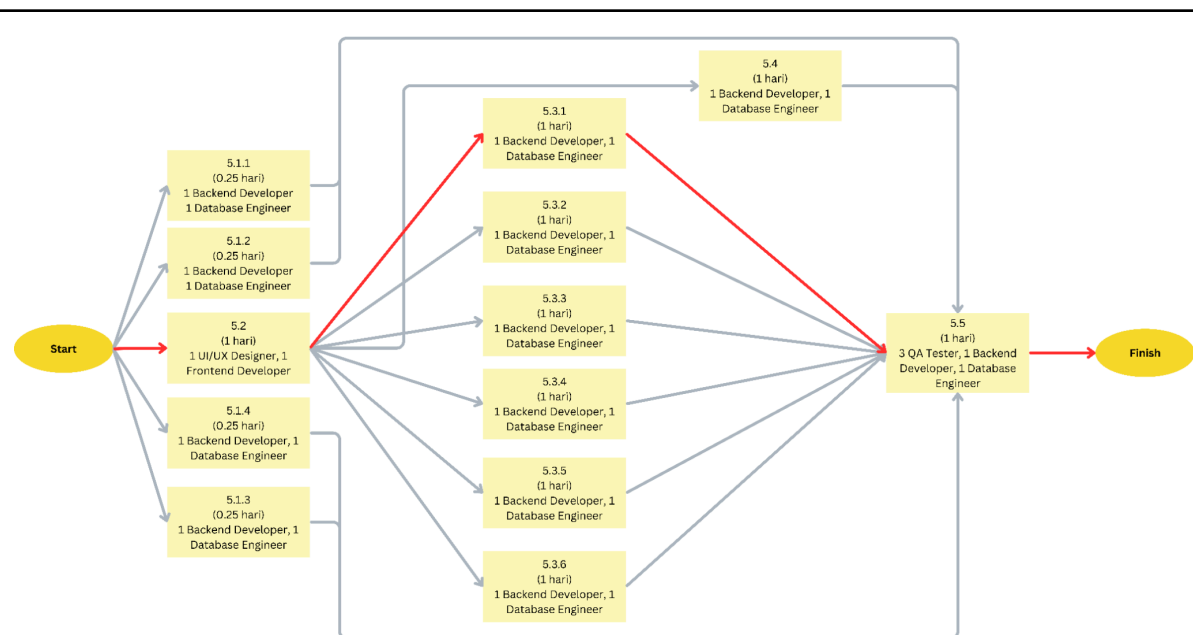

**Sprint 4** (3 Hari kerja)  
Critical Path: 5.2 → 5.3.1 → 5.5 → Finish

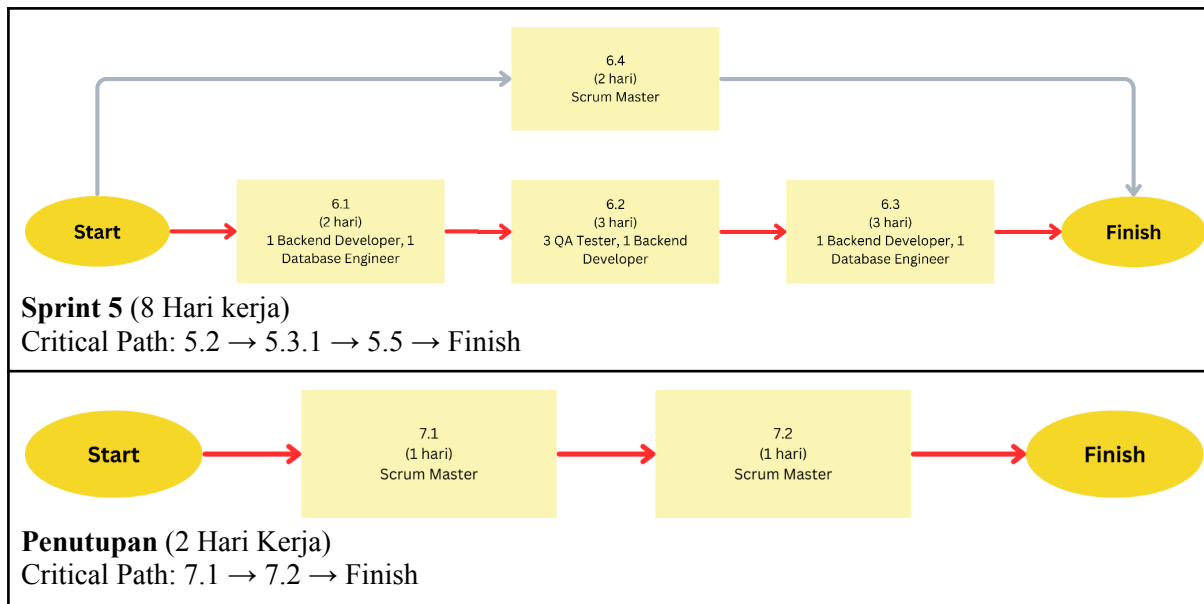

## 2.4. Jadwal Kegiatan, SDM, Alat, dan Pengeluaran

**Tabel Satuan Gaji**

| Jenis Pekerjaan         | Gaji / Hari  |
|-------------------------|--------------|
| Backend Developer (BD)  | Rp 80.000,-  |
| Frontend Developer (FD) | Rp 70.000,-  |
| Database Engineer (DE)  | Rp 70.000,-  |
| System Analyst (SA)     | Rp 70.000,-  |
| UI/UX Designer (UD)     | Rp 70.000,-  |
| QA Tester (QT)          | Rp 50.000,-  |
| Scrum Master (SM)       | Rp 100.000,- |

**Tabel Satuan Beli Alat**

| Nama Alat             | Harga Sewa atau Harga beli |
|-----------------------|----------------------------|
| Komputer / Laptop (K) | Rp 15.000,- / Hari         |
| Kertas A4 (A4)        | Rp 1000,- /Pcs             |
| Pena (P)              | Rp 5000,-/Pcs              |
| Sticky notes (SN)     | Rp 500,- /Pcs              |
| Text Editor (TE)      | Gratis                     |
| Astah (A)             | Gratis                     |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SSMS              | Gratis |
| IDE               | Gratis |
| Email / Messenger | Gratis |

**Jadwal kegiatan, SDM, alat dan pengeluaran:**

• **Jadwal Persiapan (Sprint 0)**

| No                 | Nama Paket                                  | Jadwal Paket Pekerjaan<br>(Satuan: 1 Hari) |        |                 |        |        |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|
|                    |                                             | Masa Persiapan                             |        |                 |        |        |
|                    |                                             | 1                                          | 2      | 3               | 4      | 5      |
| 1.1                | Membaca dan Memahami TOR                    | Full                                       | Full   |                 |        |        |
| 1.2                | Menentukan User Stories dan Backlog product |                                            |        | Full            | Full   | Full   |
| Jadwal SDM         |                                             | 2BD, 1FD, 1SM, 1SA, 1DE, 1UD, 3QT          |        |                 |        |        |
| Jadwal Alat        |                                             | 10K                                        | 10K    | 10A4 , 70SN, 5P |        |        |
| Gaji SDM           |                                             | 690 rb                                     | 690 rb | 690 rb          | 690 rb | 690 rb |
| Biaya Alat         |                                             | 150 rb                                     | 150 rb | 70 rb           | 70 rb  | 70 rb  |
| Pengeluaran Proyek |                                             | 840 rb                                     | 840 rb | 760 rb          | 760 rb | 760 rb |

• **Jadwal Sprint 1**

| No    | Nama Paket                                            | Jadwal Paket Pekerjaan<br>(Satuan: 1 Hari) |            |            |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|----|
|       |                                                       | Sprint ke-1                                |            |            |   |   |   |   |   |   |    |
|       |                                                       | 1                                          | 2          | 3          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1   | Mendesain ERD                                         | 1BD, 1DE                                   | 1BD<br>1DE | 1BD<br>1DE |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.2.1 | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Login         | 1BD<br>1SA                                 |            |            |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.2.2 | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Register      |                                            | 1BD<br>1SA |            |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.2.3 | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Melihat Kanal |                                            |            | 1BD<br>1SA |   |   |   |   |   |   |    |

|                           |                                                         |                   |                   |                   |                   |            |            |            |            |            |   |   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| 2.2.4                     | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Menonton Konten |                   |                   |                   | 1BD<br>1SA        |            |            |            |            |            |   |   |
| 2.3                       | Melakukan Pengelompokan Fitur                           |                   |                   |                   |                   | 1SM<br>1SA |            |            |            |            |   |   |
| 2.4.1                     | Merancang prototipe awal Login                          |                   |                   |                   |                   |            | 1UD<br>1SA |            |            |            |   |   |
| 2.4.2                     | Merancang prototipe awal Register                       |                   |                   |                   |                   |            |            | 1UD<br>1SA |            |            |   |   |
| 2.4.3                     | Merancang prototipe awal Home Page                      |                   |                   |                   |                   |            |            |            | 1UD<br>1SA |            |   |   |
| 2.4.4                     | Merancang prototipe awal Video                          |                   |                   |                   |                   |            |            |            |            | 1UD<br>1SA |   |   |
| <b>Jadwal SDM</b>         |                                                         | 2BD<br>1SA<br>1DE | 2BD<br>1SA<br>1DE | 2BD<br>1SA<br>1DE | 2BD<br>1DE<br>1SA | 1SM<br>1SA | 1UD<br>1SA | 1UD<br>1SA | 1UD<br>1SA | 1UD<br>1SA | - | - |
| <b>Jadwal Alat</b>        |                                                         | 4K                | 4K                | 4K                | 4K                | 2K         | 2K         | 2K         | 2K         | 2K         | - | - |
| <b>Gaji SDM</b>           |                                                         | 300<br>rb         | 300<br>rb         | 300<br>rb         | 300<br>rb         | 170<br>rb  | 140<br>rb  | 140<br>rb  | 140<br>rb  | 140<br>rb  | - | - |
| <b>Biaya Alat</b>         |                                                         | 60<br>rb          | 60<br>rb          | 60<br>rb          | 60<br>rb          | 30<br>rb   | 30<br>rb   | 30<br>rb   | 30<br>rb   | 30<br>rb   | - | - |
| <b>Pengeluaran Proyek</b> |                                                         | 360<br>rb         | 360<br>rb         | 360<br>rb         | 360<br>rb         | 200<br>rb  | 170<br>rb  | 170<br>rb  | 170<br>rb  | 170<br>rb  | - | - |

• **Jadwal Sprint 2**

| No    | Nama Paket                                         | Jadwal Paket Pekerjaan<br>(Satuan: 1 Hari) |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|       |                                                    | Sprint ke-2                                |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                    | 1                                          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.1   | Membuat Database                                   | 1DE,<br>1BD                                |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Menyusun alur interaksi CLI untuk membuat kanal    | 1SA<br>1BD                                 |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Menyusun alur interaksi CLI untuk upload           |                                            | 1SA<br>1BD |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Menyusun alur interaksi CLI untuk edit konten      |                                            |            | 1SA<br>1BD |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Menyusun alur interaksi CLI untuk subscribe        |                                            |            |            | 1SA<br>1BD |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Menyusun alur interaksi CLI untuk remove video     |                                            |            |            |            | 1SA<br>1BD |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Menyusun alur interaksi CLI untuk like dan dislike |                                            |            |            |            |            | 1SA<br>1BD |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Menyusun alur interaksi CLI untuk logout           |                                            |            |            |            |            |            | 1SA<br>1BD |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Menyusun alur interaksi CLI untuk invite role      |                                            |            |            |            |            |            |            | 1SA<br>1BD |  |  |  |  |  |  |

|                    |                                            |                      |  |                          |            |                      |            |                      |            |                          |            |                          |            |            |  |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 3.2.9              | Menyusun alur interaksi CLI untuk komentar |                      |  |                          |            |                      |            |                      | 1SA<br>1BD |                          |            |                          |            |            |  |
| 3.3.1              | Merancang prototipe Kanal                  |                      |  |                          | 1BD<br>1UD |                      |            |                      |            |                          |            |                          |            |            |  |
| 3.3.2              | Merancang prototipe Upload                 |                      |  |                          |            |                      | 1UD<br>1BD |                      |            |                          |            |                          |            |            |  |
| 3.3.3              | Merancang prototipe Member                 |                      |  |                          |            |                      |            |                      |            | 1UD<br>1 BD              |            |                          |            |            |  |
| 3.3.4              | Merancang prototipe Edit & Remove Video    |                      |  |                          |            |                      |            |                      | 1UD<br>1BD |                          |            |                          |            |            |  |
| 3.4                | Implementasi fungsi & tipe kanal           |                      |  |                          |            |                      |            |                      |            |                          | 1DE<br>1BD |                          |            |            |  |
| 3.5                | Uji coba fungsi dasar kanal                |                      |  |                          |            |                      |            |                      |            |                          |            |                          | 3QT<br>1BD |            |  |
| Jadwal SDM         |                                            | 2 BD<br>1 DE<br>1 SA |  | 1 SA<br>1,5 BD<br>0,5 UD |            | 1 SA<br>2 BD<br>1 UD |            | 1 SA<br>2 BD<br>1 UD |            | 0,5 SA<br>1,5 BD<br>1 UD |            | 0,5 UD<br>1,5 BD<br>1 DE |            | 3QT<br>1BD |  |
| Jadwal Alat        |                                            | 4K                   |  | 4K                       |            | 4K                   |            | 4K                   |            | 4K                       |            | 4K                       |            | 4K         |  |
| Gaji SDM           |                                            | 300 rb               |  | 225 rb                   |            | 300 rb               |            | 300 rb               |            | 225 rb                   |            | 225 rb                   |            | 230 rb     |  |
| Biaya Alat         |                                            | 60 rb                |  | 60 rb                    |            | 60 rb                |            | 60 rb                |            | 60 rb                    |            | 60 rb                    |            | 60 rb      |  |
| Pengeluaran Proyek |                                            | 360 rb               |  | 285 rb                   |            | 360 rb               |            | 360 rb               |            | 285 rb                   |            | 285 rb                   |            | 290 rb     |  |




• **Jadwal Keseluruhan**

| No | Nama Paket | Jadwal Paket Pekerjaan<br>(Satuan: 3 Hari) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----|------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|    |            | Seluruh Proyek                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|    |            | 1                                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1  | Persiapan  | ■                                          | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 2  | Sprint 1   |                                            |   | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 3  | Sprint 2   |                                            |   |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |    |    |    |    |    |
| 4  | Sprint 3   |                                            |   |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■  |    |    |    |    |
| 5  | Sprint 4   |                                            |   |   |   |   |   |   |   | ■ | ■  | ■  | ■  |    |    |
| 6  | Sprint 5   |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 7  | Closing    |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  | ■  |

## 2.5. Organisasi Proyek

### Struktur Organisasi

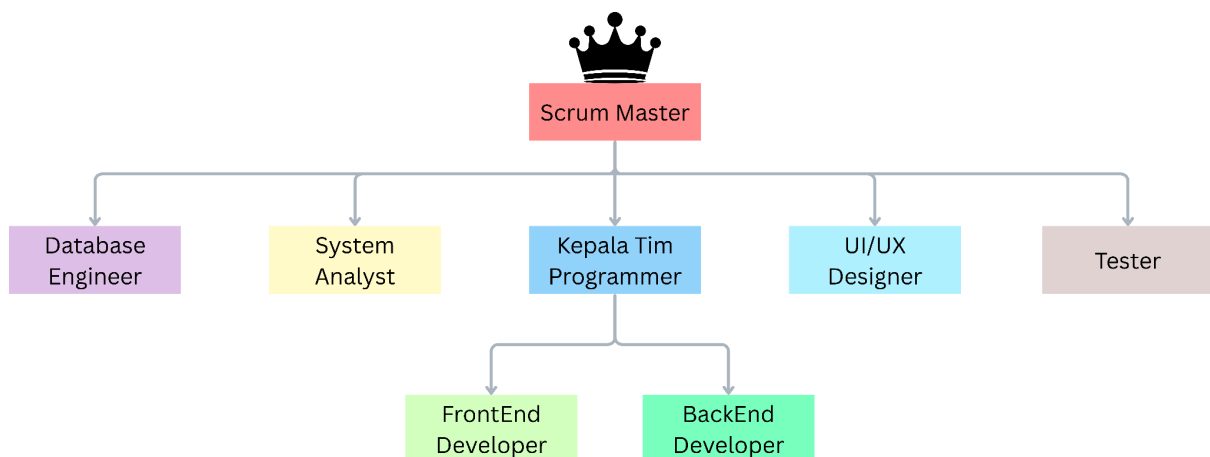

### Responsibility Assignment Matrix (RAM)

| No.   | Paket Pekerjaan                                         | Axel (SM) | Keane (BD) | Davin (BD) | Alex (FD) | Ares (DE) | Athena (SA) | Charon (UD) | Hermes (QT) | Hades (QT) | Papin (QT) |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1.1   | Membaca dan memahami TOR                                | A,R       | R          | R          | R         | R         | R           | R           | R           | R          | R          |
| 1.2   | Menentukan User Stories dan Backlog product             | A,R,Q     | I          | I          | I         | I         | I           | I           | I           | I          | I          |
| 2.1   | Mendesain ERD                                           |           | R          |            |           | A,R       | C           |             |             |            |            |
| 2.2.1 | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Login           |           |            | R          |           |           | A,R         |             |             |            |            |
| 2.2.2 | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Register        |           |            | R          |           |           | A,R         |             |             |            |            |
| 2.2.3 | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Melihat Kanal   |           |            | R          |           |           | A,R         |             |             |            |            |
| 2.2.4 | Menyusun alur interaksi CLI untuk fitur Menonton Konten |           |            | R          |           |           | A,R         |             |             |            |            |
| 2.3   | Melakukan Pengelompokan Fitur                           | R         |            |            | C         |           | A,R         |             |             |            |            |
| 2.4.1 | Merancang prototipe awal Login                          |           |            |            |           |           | R           | A,R         |             |            |            |
| 2.4.2 | Merancang prototipe awal Register                       |           |            |            |           |           | R           | A,R         |             |            |            |
| 2.4.3 | Merancang prototipe awal Home Page                      |           |            |            |           |           | R           | A,R         |             |            |            |
| 2.4.4 | Merancang prototipe awal Video                          |           |            |            |           |           | R           | A,R         |             |            |            |
| 3.1   | Membuat Database                                        |           |            | R          |           | A,R       |             |             |             |            |            |

|       |                                                    |  |       |   |  |   |     |     |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------|--|-------|---|--|---|-----|-----|--|--|--|
| 3.2.1 | Menyusun alur interaksi CLI untuk membuat kanal    |  | R     |   |  |   | A,R |     |  |  |  |
| 3.2.2 | Menyusun alur interaksi CLI untuk upload           |  | R     |   |  |   | A,R |     |  |  |  |
| 3.2.3 | Menyusun alur interaksi CLI untuk edit konten      |  | R     |   |  |   | A,R |     |  |  |  |
| 3.2.4 | Menyusun alur interaksi CLI untuk subscribe        |  | R     |   |  |   | A,R |     |  |  |  |
| 3.2.5 | Menyusun alur interaksi CLI untuk remove video     |  | R     |   |  |   | A,R |     |  |  |  |
| 3.2.6 | Menyusun alur interaksi CLI untuk like dan dislike |  | R     |   |  |   | A,R |     |  |  |  |
| 3.2.7 | Menyusun alur interaksi CLI untuk logout           |  | R     |   |  |   | A,R |     |  |  |  |
| 3.2.8 | Menyusun alur interaksi CLI untuk invite role      |  | R     |   |  |   | A,R |     |  |  |  |
| 3.2.9 | Menyusun alur interaksi CLI untuk komentar         |  | R     |   |  |   | A,R |     |  |  |  |
| 3.3.1 | Merancang prototipe Kanal                          |  |       | R |  |   | C   | A,R |  |  |  |
| 3.3.2 | Merancang prototipe Upload                         |  |       | R |  |   | C   | A,R |  |  |  |
| 3.3.3 | Merancang prototipe Member                         |  |       | R |  |   | C   | A,R |  |  |  |
| 3.3.4 | Merancang prototipe Edit & Remove Video            |  |       | R |  |   | C   | A,R |  |  |  |
| 3.4   | Implementasi fungsi & tipe kanal                   |  | A,R,Q |   |  | R |     |     |  |  |  |

|       |                                      |  |           |     |  |     |   |     |     |   |   |
|-------|--------------------------------------|--|-----------|-----|--|-----|---|-----|-----|---|---|
| 3.5   | Uji coba fungsi dasar kanal          |  |           |     |  |     |   |     | A,R | R | R |
| 4.1.1 | Implementasi manajemen upload video  |  | A,R,<br>Q |     |  | R   |   |     |     |   |   |
| 4.1.2 | Implementasi manajemen edit video    |  | A,R,<br>Q |     |  | R   |   |     |     |   |   |
| 4.1.3 | Implementasi manajemen remove video  |  | A,R,<br>Q |     |  | R   |   |     |     |   |   |
| 4.2.1 | Sistem hak akses Owner               |  |           | A,R |  |     | R |     |     |   |   |
| 4.2.2 | Sistem hak akses Manager             |  |           | A,R |  | C   | R |     |     |   |   |
| 4.2.3 | Sistem hak akses Subtitle Editor     |  |           | A,R |  | C   | R |     |     |   |   |
| 4.2.4 | Sistem hak akses Editor              |  |           | A,R |  | C   | R |     |     |   |   |
| 4.2.5 | Sistem hak akses Viewer              |  |           | A,R |  | C   | R |     |     |   |   |
| 4.2.6 | Sistem hak akses Editor Limited      |  |           | A,R |  | C   | R |     |     |   |   |
| 4.3   | Uji coba fungsi video & hak akses    |  |           |     |  |     |   |     | A,R | R | R |
| 5.1.1 | Implementasi fitur Like              |  | A,R,<br>Q |     |  | R   |   |     |     |   |   |
| 5.1.2 | Implementasi fitur Dislike           |  | A,R,<br>Q |     |  | R   |   |     |     |   |   |
| 5.1.3 | Implementasi fitur Komentar          |  | A,R,<br>Q |     |  | R   |   |     |     |   |   |
| 5.1.4 | Implementasi fitur Subscribe         |  | A,R,<br>Q |     |  | R   |   |     |     |   |   |
| 5.2   | Membuat beranda kanal                |  | R         |     |  |     |   | A,R |     |   |   |
| 5.3.1 | Edit deskripsi kanal individu & grup |  |           | A,R |  | R,C |   |     |     |   |   |

|       |                                             |      |     |     |  |     |  |  |     |   |   |
|-------|---------------------------------------------|------|-----|-----|--|-----|--|--|-----|---|---|
| 5.3.2 | Hapus video pada kanal individu & grup      |      |     | A,R |  | R,C |  |  |     |   |   |
| 5.3.3 | Edit video pada kanal individu & grup       |      |     | A,R |  | R,C |  |  |     |   |   |
| 5.3.4 | Edit profil kanal individu & grup           |      |     | A,R |  | R,C |  |  |     |   |   |
| 5.3.5 | Upload video kanal individu & grup          |      |     | A,R |  | R,C |  |  |     |   |   |
| 5.3.6 | Ubah role pada kanal grup                   |      |     | A,R |  | R,C |  |  |     |   |   |
| 5.4   | Dashboard laporan performa                  |      | A,R |     |  | R,C |  |  |     |   |   |
| 5.5   | Pengujian fungsional sistem & perbaikan bug |      |     |     |  |     |  |  | A,R | R | R |
| 6.1   | Integrasi akhir seluruh fitur               |      | A,R |     |  | R   |  |  |     |   |   |
| 6.2   | System testing & UAT                        |      |     |     |  |     |  |  | A,R | R | R |
| 6.3   | Menangani bug setelah testing               |      | A,R |     |  | R   |  |  |     |   |   |
| 6.4   | Dokumentasi proyek                          | A,R  |     |     |  |     |  |  |     |   |   |
| 7.1   | Contact Klien                               | A, R |     |     |  |     |  |  |     |   |   |
| 7.2   | Launching Proyek                            | A, R |     |     |  |     |  |  |     |   |   |

\*R-Responsible (works on), A-Accountable, C-Consulted, I-Informed, Q- Quality Reviewer

### Ringkasan Tugas, Peran dan Tanggung-jawab Tim

| No. | Nama                      | Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Axel (Scrum Master)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin tim dan bertanggung jawab penuh atas proyek (Accountable).</li> <li>• Membaca dan memahami TOR serta memastikan scope jelas.</li> <li>• Menentukan user stories dan backlog.</li> <li>• Mengawasi implementasi kanal, video, fitur, dan hak akses.</li> <li>• Memastikan dokumentasi proyek lengkap.</li> <li>• Menjadi penghubung dengan klien, termasuk saat contact client &amp; launching.</li> </ul> |
| 2.  | Keane (Backend Developer) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengimplementasikan fungsi backend: kanal, upload, edit, remove video, like/dislike, komentar, subscribe.</li> <li>• Membuat database dan mengelola logika server.</li> <li>• Bertanggung jawab dalam uji coba fungsi kanal &amp; video.</li> <li>• Membantu integrasi akhir dan perbaikan bug setelah testing.</li> </ul>                                                                                         |
| 3.  | Davin (Backend Developer) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berperan mirip dengan Keane, fokus di backend.</li> <li>• Menyusun alur interaksi CLI untuk login, register, melihat kanal, menonton konten, dan fitur kanal lain.</li> <li>• Mengimplementasikan hak akses (Owner, Manager, Editor, Subtitle Editor, Viewer).</li> <li>• Mendukung integrasi sistem dan bug fixing.</li> </ul>                                                                                    |
| 4.  | Alex (Frontend Developer) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang prototipe awal: login, register, homepage, video.</li> <li>• Merancang prototipe kanal, upload, member, edit/remove video.</li> <li>• Membuat tampilan beranda kanal.</li> <li>• Bekerja sama dengan UI/UX Designer untuk memastikan tampilan sesuai user experience.</li> </ul>                                                                                                                         |
| 5.  | Ares (Database Engineer)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendesain ERD dan struktur database.</li> <li>• Membuat serta mengelola database.</li> <li>• Menjamin konsistensi data untuk fitur kanal, video, dan user.</li> <li>• Memberi masukan terkait performa database dan optimisasi query.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| 6.  | Athena (System Analyst)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami TOR dan requirement.</li> <li>• Memberi masukan (Consulted) pada desain database, pengelompokan fitur, dan prototipe.</li> <li>• Memastikan sistem sesuai kebutuhan bisnis.</li> <li>• Menjadi penghubung antara tim developer dan product owner.</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 7.  | Charon                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang prototipe awal bersama Frontend Developer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (UI/UX Designer)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Membuat user interface: login, register, home page, video, kanal, upload, edit &amp; remove video, member.</li> <li>● Menjamin prototipe sesuai prinsip user experience.</li> </ul>                                        |
| 8.  | Hermes<br>(Quality Tester) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan uji coba fungsi dasar kanal.</li> <li>● Menguji fungsi video &amp; hak akses.</li> <li>● Menguji fungsional sistem &amp; membantu menemukan bug.</li> <li>● Ikut serta dalam system testing &amp; UAT</li> </ul> |
| 9.  | Hades<br>(Quality Tester)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan tugas yang sama dengan Hermes</li> <li>● Menguji fungsi dasar kanal, video &amp; hak akses, fungsional sistem.</li> <li>● Memberi laporan bug dan validasi perbaikan.</li> </ul>                                 |
| 10. | Papin<br>(Quality Tester)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mendukung Hermes &amp; Hades dalam testing.</li> <li>● Fokus pada UAT (User Acceptance Testing).</li> <li>● Membantu regression test setelah bug fixing.</li> </ul>                                                        |

### III. Anggaran Proyek

#### 5.1. Komponen gaji SDM:

| No     | Deskripsi          | Satuan Waktu (hari) | Biaya/harga per Satuan | Sub Total       |
|--------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 1.     | Scrum Master       | 9 hari              | Rp 100.000,- /hari     | Rp 900.000,-    |
| 2.     | System Analyst     | 27 hari             | Rp 70.000,- /hari      | Rp 1.890.000,-  |
| 3.     | Frontend Developer | 6 hari              | Rp 70.000,- /hari      | Rp 420.000,-    |
| 4.     | Backend Developer  | 63 hari             | Rp 80.000,- /hari      | Rp 5.040.000,-  |
| 5.     | Tester             | 37 hari             | Rp 50.000,- /hari      | Rp 1.850.000    |
| 6.     | Database Engineer  | 27 hari             | Rp 70.000,- /hari      | Rp 1.890.000,-  |
| 7.     | UI/UX Designer     | 14 hari             | Rp 70.000,- /hari      | Rp 980.000,-    |
| Total: |                    |                     |                        | Rp 12.970.000,- |

#### 5.2. Komponen sewa alat:

| No     | Deskripsi             | Satuan atau Jumlah | Biaya/harga Satuan | Sub Total      |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1.     | Komputer / Laptop (K) | 144                | Rp 15.000/hari     | Rp 2.160.000,- |
| 2.     | Kertas A4 (A4)        | 10                 | Rp 1000,- /Pcs     | Rp 10.000,-    |
| 3.     | Pena (P)              | 5                  | Rp 5000,- /Pcs     | Rp 25.000,-    |
| 4.     | Sticky notes (SN)     | 70                 | Rp 500,- /Pcs      | Rp 35.000,-    |
| 5.     | Text Editor (TE)      | 10                 | Gratis             | Rp 0,-         |
| 6.     | Astah (A)             | 10                 |                    |                |
| 7.     | SSMS                  | 10                 |                    |                |
| 8.     | IDE                   | 10                 |                    |                |
| 9.     | Email / Messenger     | 10                 |                    |                |
| Total: |                       |                    |                    | Rp 2.230.000,- |

#### 5.3. Anggaran keseluruhan proyek:

| No     | Komponen Anggaran | Sub Total       |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1      | Gaji SDM          | Rp 12.970.000,- |
| 2      | Beli alat         | Rp 2.230.000,   |
| Total: |                   | Rp 15.200.000,- |



## **Lampiran**

[https://drive.google.com/file/d/1z2DpS9ugc0khF\\_yHJU7n11d520ZEvSJM/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1z2DpS9ugc0khF_yHJU7n11d520ZEvSJM/view?usp=drive_link) (TOR)
